


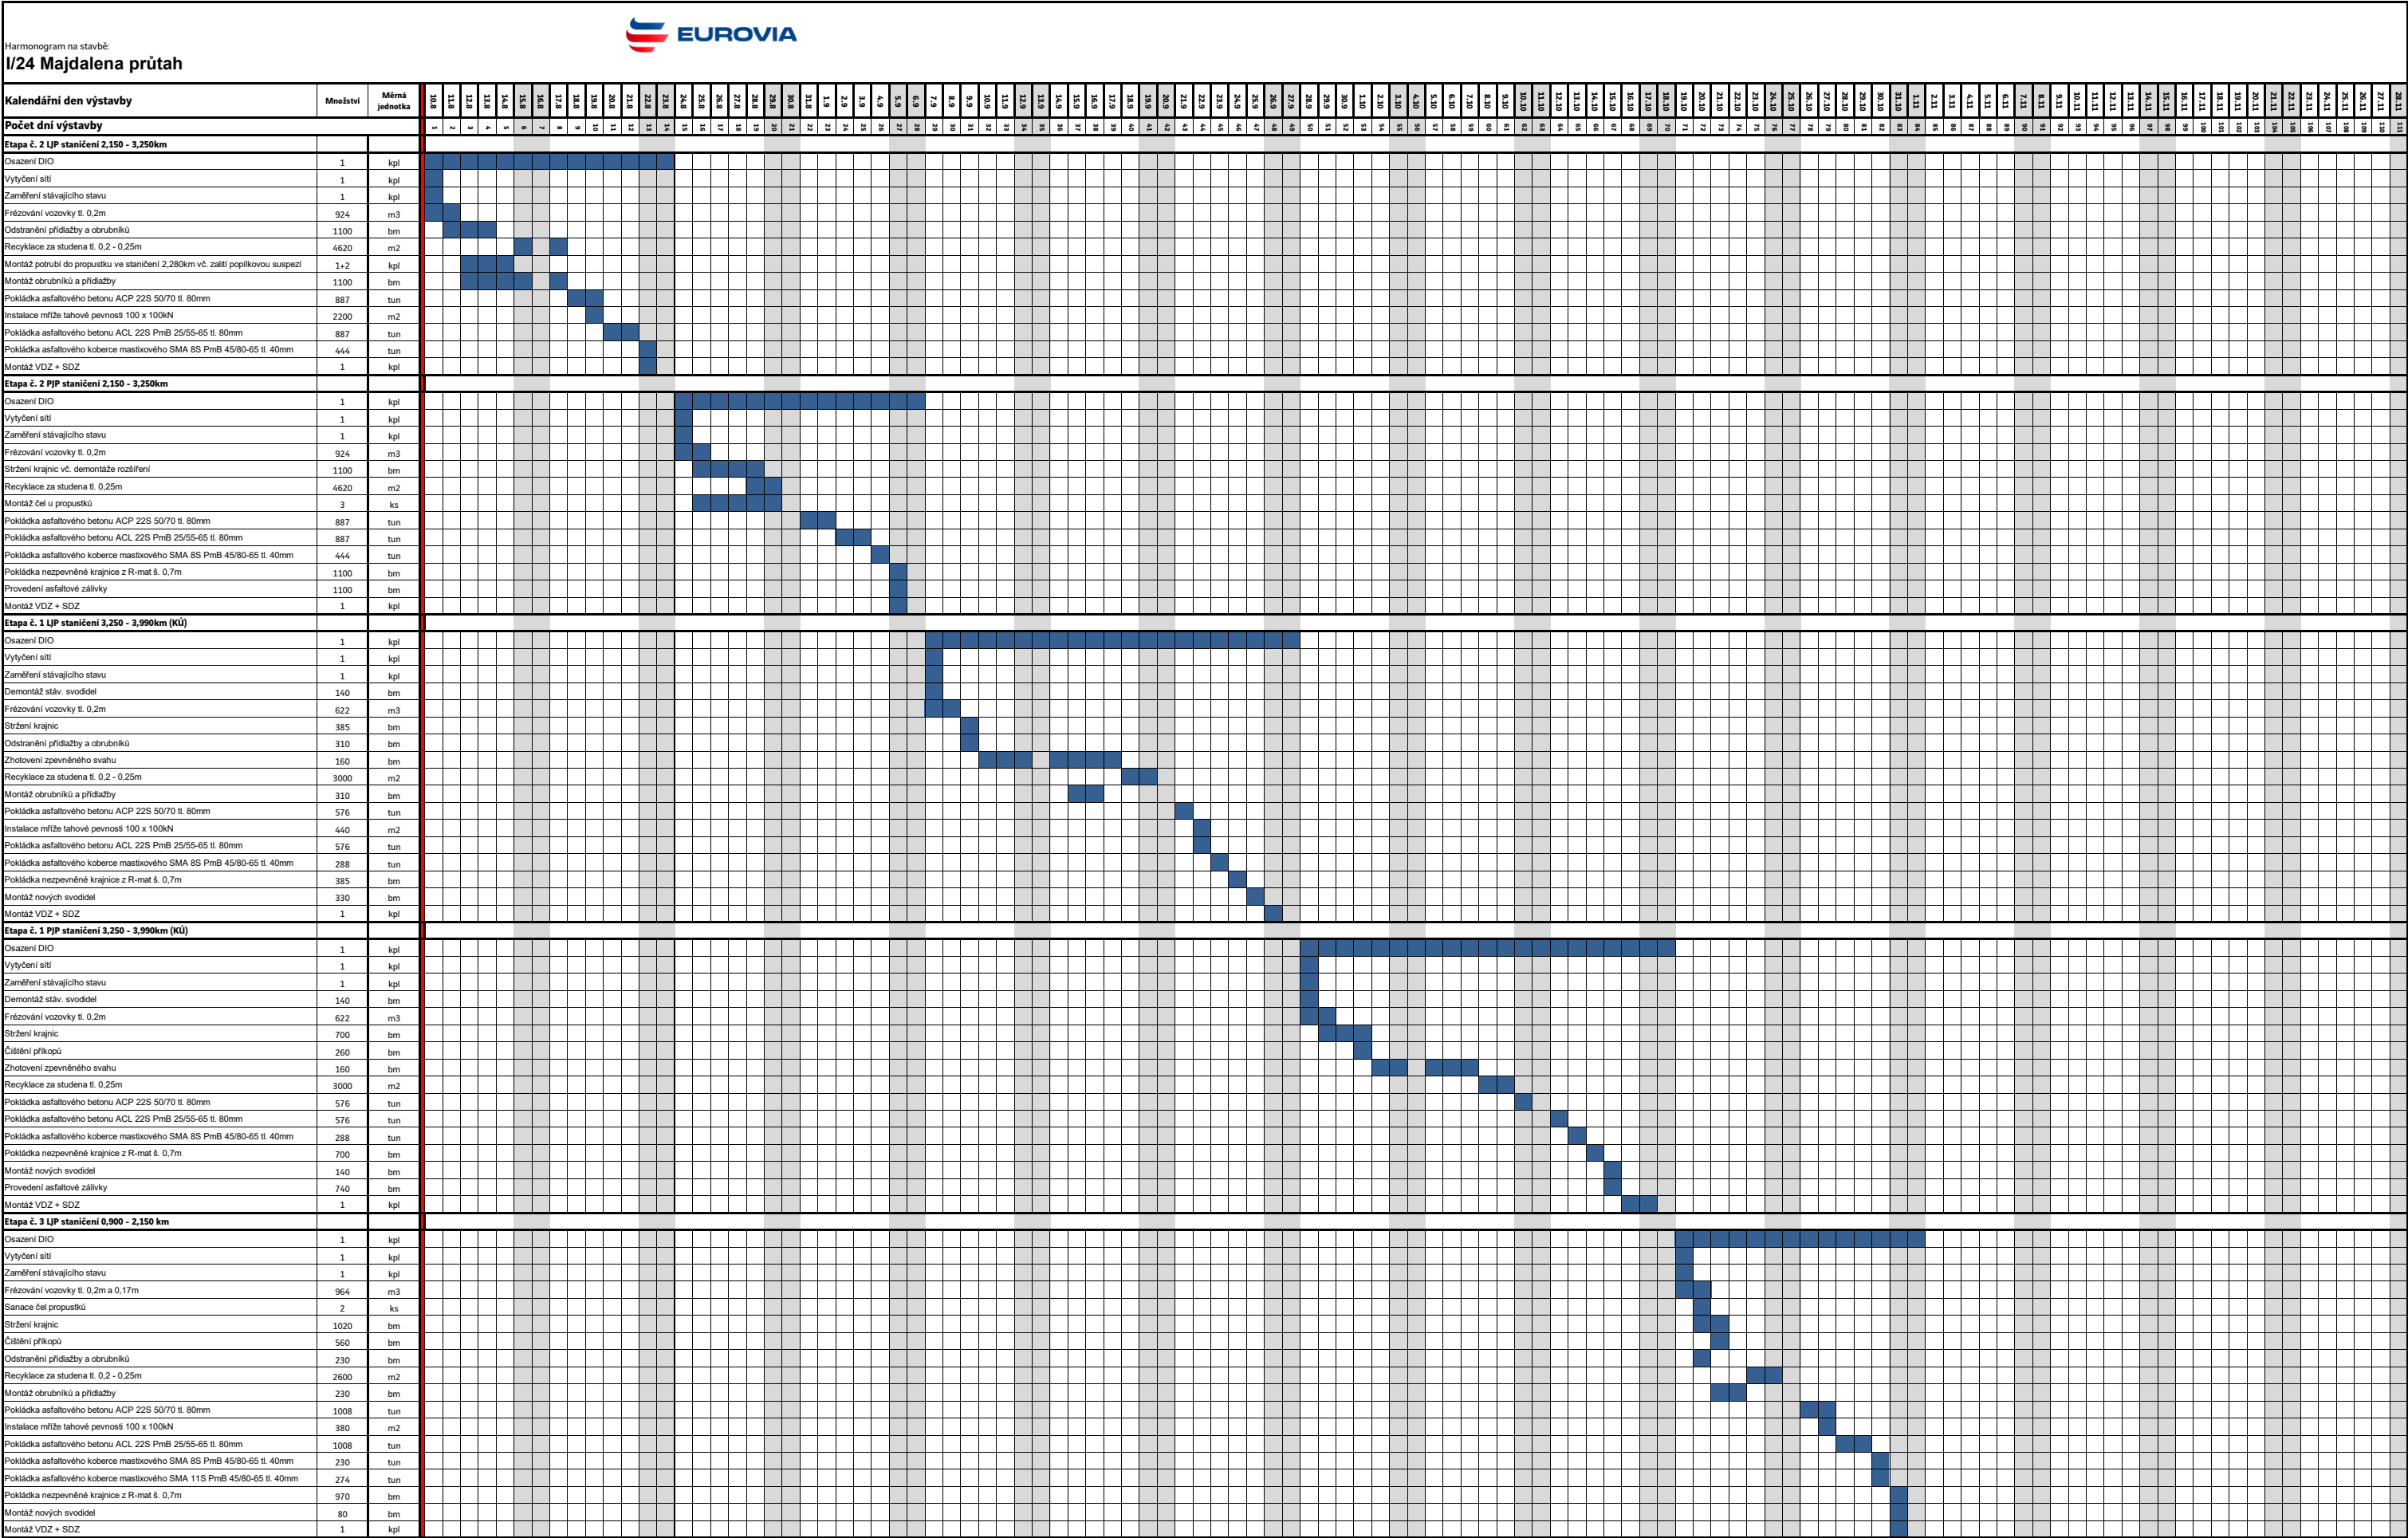

Etapa č. 3 PJP staničení 0,900 - 2,150 km		
Osazení DIO	1	kpl
Vytyčení sítí	1	kpl
Zaměření stávajícího stavu	1	kpl
Demontáž stáv. svodidel	160	bm
Frézování vozovky tl. 0,2m a 0,17m	964	m3
Sanace čel propustků	2	ks
Stržení krajnic	1150	bm
Čištění příkopů	670	bm
Recyklace za studena tl. 0,25m	2600	m2
Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm	1008	tun
Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm	1008	tun
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 8S PmB 45/80-65 tl. 40mm	230	tun
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40mm	274	tun
Pokládka nepevněné krajnice z R-mat š. 0,7m	1150	bm
Montáž nových svodidel	240	bm
Provedení asfaltové závlivky	1250	bm
Montáž VDZ + SDZ	1	kpl
Etapa č. 4 LJP staničení ZÚ - 0,900 km		
Osazení DIO	1	kpl
Vytyčení sítí	1	kpl
Zaměření stávajícího stavu	1	kpl
Demontáž stáv. svodidel	304	bm
Frézování vozovky tl. 0,17m	643	m3
Sanace čel propustků	1	ks
Stržení krajnic	800	bm
Čištění příkopů	800	bm
Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm	685	tun
Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm	685	tun
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40mm	342	tun
Pokládka nepevněné krajnice z R-mat š. 0,7m	800	bm
Montáž nových svodidel	304	bm
Montáž VDZ + SDZ	1	kpl
Etapa č. 4 PJP staničení ZÚ - 0,900 km		
Osazení DIO	1	kpl
Vytyčení sítí	1	kpl
Zaměření stávajícího stavu	1	kpl
Demontáž stáv. svodidel	304	bm
Frézování vozovky tl. 0,17m	643	m3
Sanace čel propustků	1	ks
Stržení krajnic	800	bm
Čištění příkopů	800	bm
Pokládka asfaltového betonu ACL 16+ 50/70 tl. prům. tl. 50mm (odpočívka)	210	tun
Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm	685	tun
Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm	685	tun
Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40mm	505	tun
Pokládka nepevněné krajnice z R-mat š. 0,7m	800	bm
Montáž nových svodidel	304	bm
Provedení asfaltové závlivky	900	bm
Montáž VDZ + SDZ	1	kpl
