Harmonogram na stavbě:

# I/24 Majdalena prútah

EUROVIA

| Kalendářní den výstavby | Množství | Měrná jednotka |
|---|---|---|
| **Počet dní výstavby** | | |
| **Etapa č. 2 LJP staničení 2,250 - 3,250km** | | |
| Osazení DIO | 1 | kpl |
| Vytýčení sítí | 1 | kpl |
| Zaměření stávajícího stavu | 1 | kpl |
| Frézování vozovky tl. 0,2m | 924 | m3 |
| Odstranění přídlažby a obrubníku | 1100 | bm |
| Recyklace za studena tl. 0,2 - 0,25m | 4620 | m2 |
| Montáž potrubí do propustku ve staničení 2,280km vč. zalití pouličkovou zatěrkou | 2+2 | kpl |
| Montáž obrubníků a přídlažby | 1100 | bm |
| Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm | 887 | tun |
| Instalace mříže tahové pevnosti 100 x 100kN | 2200 | m2 |
| Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 60mm | 867 | tun |
| Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 8S PmB 45/80-65 tl. 40mm | 444 | tun |
| Montáž VDZ + SDZ | 1 | kpl |
| **Etapa č. 2 PJP staničení 2,150 - 3,250km** | | |
| Osazení DIO | 1 | kpl |
| Vytýčení sítí | 1 | kpl |
| Zaměření stávajícího stavu | 1 | kpl |
| Frézování vozovky tl. 0,2m | 924 | m3 |
| Stržení krajnic vč. demontáže nosiliní | 1100 | bm |
| Recyklace za studena tl. 0,25m | 4620 | m2 |
| Montáž čel u propustku | 3 | ks |
| Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm | 887 | tun |
| Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 60mm | 867 | tun |
| Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 8S PmB 45/80-65 tl. 40mm | 444 | tun |
| Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m | 1100 | bm |
| Provedení asfaltové zálivky | 1100 | bm |
| Montáž VDZ + SDZ | 1 | kpl |
| **Etapa č. 1 LJP staničení 3,250 - 3,990km (MÚ)** | | |
| Osazení DIO | 1 | kpl |
| Vytýčení sítí | 1 | kpl |
| Zaměření stávajícího stavu | 1 | kpl |
| Demontáž stáv. svodidel | 140 | bm |
| Frézování vozovky tl. 0,2m | 622 | m3 |
| Stržení krajnic | 385 | bm |
| Odstranění přídlažby a obrubníku | 110 | bm |
| Zhotovení zpevněného svahu | 140 | bm |
| Recyklace za studena tl. 0,2 - 0,25m | 2000 | m2 |
| Montáž obrubníků a přídlažby | 330 | bm |
| Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm | 576 | tun |
| Instalace mříže tahové pevnosti 100 x 100kN | 440 | m2 |
| Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 60mm | 576 | tun |
| Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 8S PmB 45/80-65 tl. 40mm | 288 | tun |
| Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m | 385 | bm |
| Montáž nových svodidel | 330 | bm |
| Montáž VDZ + SDZ | 1 | kpl |
| **Etapa č. 1 PJP staničení 3,250 - 3,990km (MÚ)** | | |
| Osazení DIO | 1 | kpl |
| Vytýčení sítí | 1 | kpl |
| Zaměření stávajícího stavu | 1 | kpl |
| Demontáž stáv. svodidel | 140 | bm |
| Frézování vozovky tl. 0,2m | 622 | m3 |
| Stržení krajnic | 700 | bm |
| Čištění příkopů | 280 | bm |
| Zhotovení zpevněného svahu | 160 | bm |
| Recyklace za studena tl. 0,25m | 3000 | m2 |
| Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm | 576 | tun |
| Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 60mm | 576 | tun |
| Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 8S PmB 45/80-65 tl. 40mm | 288 | tun |
| Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m | 700 | bm |
| Montáž nových svodidel | 140 | bm |
| Provedení asfaltové zálivky | 740 | bm |
| Montáž VDZ + SDZ | 1 | kpl |
| **Etapa č. 3 LJP staničení 0,900 - 2,150 km** | | |
| Osazení DIO | 1 | kpl |
| Vytýčení sítí | 1 | kpl |
| Zaměření stávajícího stavu | 1 | kpl |
| Frézování vozovky tl. 0,2m a 0,17m | 954 | m3 |
| Sanace čel propustků | 3 | ks |
| Stržení krajnic | 1020 | bm |
| Čištění příkopů | 560 | bm |
| Odstranění přídlažby a obrubníků | 330 | bm |
| Recyklace za studena tl. 0,2 - 0,25m | 2600 | m2 |
| Montáž obrubníků a přídlažby | 230 | bm |
| Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm | 1008 | tun |
| Instalace mříže tahové pevnosti 100 x 100kN | 360 | m2 |
| Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 60mm | 1008 | tun |
| Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 8S PmB 45/80-65 tl. 40mm | 230 | tun |
| Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40mm | 230 | tun |
| Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m | 970 | bm |
| Montáž nových svodidel | 80 | bm |
| Montáž VDZ + SDZ | 1 | kpl |
| **Etapa č. 3 PJP staničení 0,900 - 2,150 km** | | |
| Osazení DIO | 1 | kpl |
| Vytýčení sítí | 1 | kpl |
| Zaměření stávajícího stavu | 1 | kpl |
| Demontáž stáv. svodidel | 160 | bm |
| Frézování vozovky tl. 0,2m a 0,17m | 954 | m3 |

**KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ**
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dopravní značení schváleno (2)
Č.j.: KUSCK - 140940/2026
Ze dne 23 -11- 2026

| | | |
|---|---|---|
| Sanace čel propustku | 2 | ks |
| Stržení krajnic | 1150 | bm |
| Čištění příkopu | 670 | bm |
| Recyklace za studena tl. 0,25m | 2600 | m2 |
| Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm | 1008 | tun |
| Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm | 1008 | tun |
| Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40mm | 230 | tun |
| Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40mm | 274 | tun |
| Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m | 1350 | bm |
| Montáž nových svodidel | 2480 | bm |
| Provedení asfaltové zálivky | 1230 | bm |
| Montáž VDZ + SDZ | 1 | kpl |
| **Etapa č. 4 LP staničení ZÚ - 0,900 km** | | |
| Osazení DIO | 1 | kpl |
| Vytýčení sítí | 1 | kpl |
| Zaměření stávajícího stavu | 1 | kpl |
| Demontáž stáv. svodidel | 304 | bm |
| Frézování vozovky tl.0,17m | 643 | m3 |
| Sanace čel propustku | 1 | ks |
| Stržení krajnic | 800 | bm |
| Čištění příkopu | 800 | bm |
| Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm | 685 | tun |
| Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm | 685 | tun |
| Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40mm | 342 | tun |
| Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m | 800 | bm |
| Montáž nových svodidel | 304 | bm |
| Montáž VDZ + SDZ | 1 | kpl |
| **Etapa č. 4 PP staničení ZÚ - 0,900 km** | | |
| Osazení DIO | 1 | kpl |
| Vytýčení sítí | 1 | kpl |
| Zaměření stávajícího stavu | 1 | kpl |
| Demontáž stáv. svodidel | 304 | bm |
| Frézování vozovky tl.0,17m | 643 | m3 |
| Sanace čel propustku | 1 | ks |
| Stržení krajnic | 800 | bm |
| Čištění příkopu | 800 | bm |
| Pokládka asfaltového betonu ACL 16+ 50/70 tl. prům. tl. 50mm (odpočívka) | 230 | tun |
| Pokládka asfaltového betonu ACP 22S 50/70 tl. 80mm | 685 | tun |
| Pokládka asfaltového betonu ACL 22S PmB 25/55-65 tl. 80mm | 685 | tun |
| Pokládka asfaltového koberce mastixového SMA 11S PmB 45/80-65 tl. 40mm | 595 | tun |
| Pokládka nezpevněné krajnice z R-mat š. 0,7m | 800 | bm |
| Montáž nových svodidel | 304 | bm |
| Provedení asfaltové zálivky | 500 | bm |
| Montáž VDZ + SDZ | 1 | kpl |

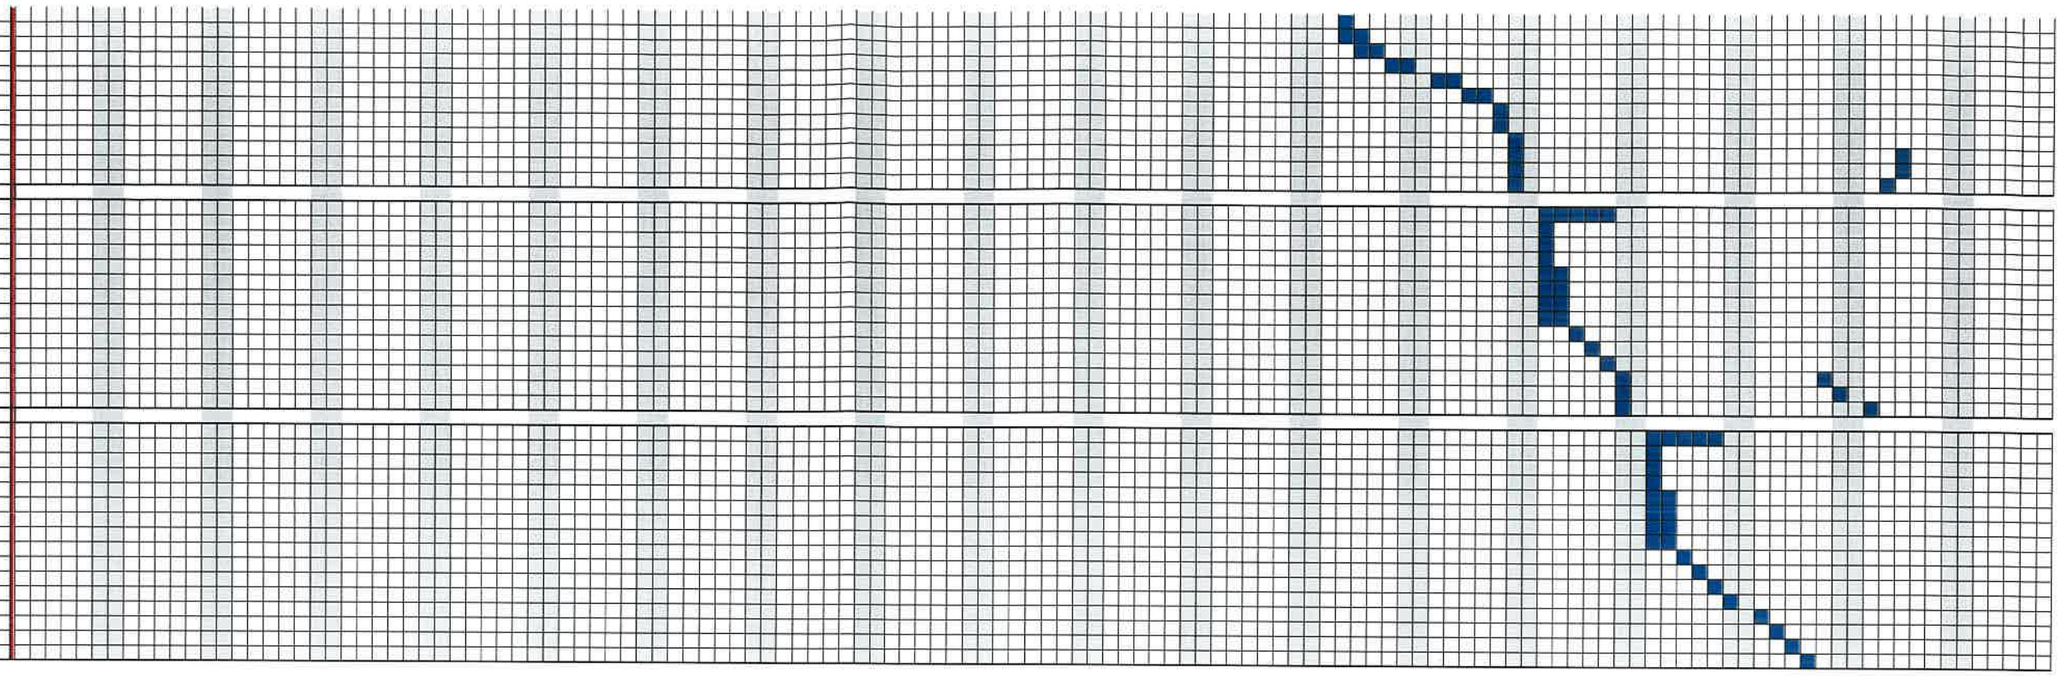

KRAJSKÝ ÚŘAD - JIHOČESKÝ KRAJ
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Dopravní značení schváleno (2)
Č.j.: KUSCK-149 246/2026
Ze dne 23-11-2026
