



# JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor kancelář hejtmana

Úsek vedoucího odboru

U Zimního stadionu 1952/2

370 76 České Budějovice



KUCBX01AXB8J

Váš dopis zn.:

Ze dne:

11. 1. 2024

Naše č. j.:

KUJCK 10988/2024

Sp. zn.:

KHEJ 5266/2024/kakr SO

Vyřizuje:

Bc. Kamila Křížová

Telefon:

386 720 225

E-mail:

krizovak@kraj-jihocesky.cz

Datum:

22. 1. 2024

## Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb.

Vážený pane inženýre,

Krajský úřad Jihočeského kraje obdržel dne 11. 1. 2024 Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 6. 1. 2024, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:

*zda v rámci realizace stavby „Rekonstrukce silnice 11/161 a 11/163 v průtahu města Vyšší Brod“ došlo pro Jihočeský kraj jako jednoho z investorů stavby ke změně rozsahu a ceny plnění za uvedené dílo. Jestliže ano, žádám o zaslání změnových listů.*

### K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:

v rámci stavby „Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“ došlo ke změně ceny plnění, jak je uvedeno v dodatcích č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo, jejíž přílohou jsou i změnové listy. Oba dodatky jsou zveřejněny v registru smluv a zasíláme Vám je v příloze.

S pozdravem

Mgr. Petr Podhola  
vedoucí odboru KHEJ

### Příloha

Dodatek č. 1.pdf

Dodatek č. 2.pdf

č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/283/22  
č. tohoto dodatku: SDL/ODSH/076/283/1

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/HD/22/20  
č. tohoto dodatku:

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje  
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:  
JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje,  
tel. č. 386 720 132  
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:  
Ivana Schwarzová, investiční technik ODSH Krajského úřadu Jihočeského  
kraje, tel. č. 386 720 106

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 3505231/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblastí, tel. č. 602 596 308  
Václavem Beranem, vedoucím OTÚ oblasti, tel. č. 602 596 308  
Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula, tel. č. 777 822 563  
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):  
Jan Křížovský, tel. č. +420 602 567 986  
Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):  
Ladislav Honner, tel. 602 157 631  
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, DiS., tel. č. 606 726 209  
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,  
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/283/22 ze dne 15. 7. 2022 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby,

provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy o dílo:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	31 457 640,04 Kč
DPH 21 %	6 606 104,41 Kč
Celkem včetně DPH	38 063 744,45 Kč

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a změnového listu č. 1 a 2:

celkem bez DPH	31 621 114,68 Kč
DPH 21 %	6 640 434,08 Kč
Celkem včetně DPH	38 261 548,76 Kč

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 a 2 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 781/2023/RK-71 ze dne 29. 6. 2023.

V Českých Budějovicích dne  
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne  
za zhotovitele:

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

.....  
STRABAG a.s.  
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti

.....  
STRABAG a.s.  
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti

**Stavba :** Rekonstrukce silnice IV/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod  
**Investor:** Jihočeský kraj, České Budějovice  
**Projektant:** ATELIER SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice  
**TDS :** Miloslav Jindra  
**Zhotovitel :** STRABAG a.s.

## REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	CENA DLE 900	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2	
		Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2
S.O. 02	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47
S.O. DIO	494 463,88	0,00	494 463,88	0,00	494 463,88
S.O. 101	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24
S.O. 303	2 275 380,02	-17 066,95	2 258 313,07	180 541,59	2 438 854,66
S.O. VN-OOT	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>31 457 640,04</b>	<b>-17 066,95</b>	<b>31 440 573,09</b>	<b>180 541,59</b>	<b>31 621 114,68</b>
DPH 21%	6 606 104,41	-3 584,06	6 602 520,35	37 913,73	6 640 434,08
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>38 063 744,45</b>	<b>-20 651,01</b>	<b>38 043 093,44</b>	<b>218 455,32</b>	<b>38 261 548,77</b>

Stavba: Rekonstrukce silnice II/181 a II/183 v průtahu města Vyšší Brod  
 číslo: 01/2023/30 - 30% - Kancelářský dostavěný

Průřez	Kód	Název položky	Míra jednotka	Množství ve zmlouvě jednotka	Množství po změně jednotka	Rozdíl množství jednotka	CENA	celková ve zmlouvě bez DPH celkem	celková po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
87		Výhledy								
40.	877390320	87 Potrubí z trubi plastových a skenářových Mondiflex tvarovek na kanalizačním přístavěm potrubí z polypropylenu PP	KUS	23,480	24,140	0,660	1 030,31	24 171,07	24 871,66	700,61
41.	28817219	Nadřadění přechodového odbočkového DN 400 Mondiflex šachtový dno	KUS	23,480	24,140	0,660	7 304,68	171 368,03	176 335,22	4 967,19
89		89 Trubní vedení - ostatní kanalizační								
49.	894412411	Osvazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	1,020	9,180	8,160	1 287,89	1 313,05	11 822,83	10 509,18
50.	59224168	Síťová betonová přechodová 82,5/100x80x12cm, stupněm poplaskovaná kapsová	KUS	1,030	9,272	8,242	2 329,43	2 389,31	21 598,47	19 199,16
		nová	KUS	0,000	0,340	0,340	11 500,00	0,00	3 910,00	3 910,00
		Vícepráce celkem						199 282,06	200 538,21	39 256,14
		CELKEM vč. DPH						41 842,83	60 093,02	8 250,09
89		Měření práce						241 094,99	268 631,23	47 536,23
54	894414211	89 Trubní vedení - ostatní kanalizační Osvazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zkrýtkových	KUS	8,160	0,000	-8,160	858,59	7 006,09	0,00	-7 006,09
55.	59224316	Deska betonová zakrytová pro kruhové šachty 100x82,5x16,5cm Měření práce celkem	KUS	8,242	0,000	-8,242	5 687,26	49 347,00	0,00	-49 347,00
		CELKEM vč. DPH						86 363,09	0,00	-86 363,09
		DPH 21 %						11 834,18	0,00	-11 834,18
		CELKEM vč. DPH						68 187,24	0,00	-68 187,24
		DPH 21 %						288 696,18	288 631,21	-17 066,95
		CELKEM vč. DPH						63 877,08	60 093,02	-3 684,06
		CELKEM vč. DPH						309 292,23	288 631,23	-20 661,01

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Schválil: Ing. František Šteclík datum: 29.6.2023

zadavatel: Jinobský kraj

TDS: IVANA SCHWARZOVÁ 29.6.2023

zhotovitel: STRABAG a.s. 6.6.23

Projekční ATELIER SIS 6.6.23





## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) Změnový list č. 1 - přípočty stavby:

SO 303 - dle výkazu výměr byly kalkulovány dražší přechodové desky místo přechodových skruží, které nebyly zakresleny v PD. Při realizaci byly provedeny a dopojeny stávající kanalizační přípojky z nemovitostí, které nebyly zpracovány v PD a proto tyto byly napojeny do nové kanalizace.

2) Změnový list č. 1 - odpočty stavby:

SO 303 - odpočet desek zákrytových, které byly schváleny ve výkazu výměr, ale nebyly v PD. Nahrazeno levnějšími přechodovými skružemi, které byly v PD.

3)

4)

5)



## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 2

1) Změnový list č. 2 - přípočty stavby:

SO 303 - při realizaci dešťové kanalizace v úseku km 0,044 - 0,111 a v km 0,121 - 0,148 bylo po odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 0,9 - 1,1m pod niveletou silnice zjištěno skalnaté podloží, které bylo na základě posouzení geologa zatříděno do jiných tříd než bylo v PD. Po vyznačení jednotlivých vrstev geologem byly tyto vrstvy následně zaměřovány a vyznačeny dle tříd těžitelnosti. V části výkopů bylo provedeno dolamování skalnatého podloží.

2) Změnový list č. 2 - odpočty stavby:

SO 303 - při realizaci dešťové kanalizace v úseku km 0,044 - 0,111 a v km 0,121 - 0,148 bylo po odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 0,9 - 1,1m pod niveletou silnice zjištěno skalnaté podloží. Ve výkazu výměr byly použity položky pro hloubení rýh v hornině třídy těžitelnosti skupiny I a II, které bylo na základě posouzení geologa zatříděno do jiných tříd těžitelnosti a proto tyto položky byly odečteny.

3)

4)

5)







**Předávací protokol č. 2****Stavba: REKONSTRUKCE SIL II/161 A II/163 V PRŮTAHU MĚSTA VYŠŠÍ BROD****Objekt: SO 303, 305**

Na základě geodetického měření ze dne 27.3., 29.3., 31.3., 4.4., 26.4., 28.4. a 3.5. za účasti geologa stavby byly zaměřeny kubatury výkopů SO 303 a SO 305 v KM 0,044 – 0,111.


kubatura výkopu v KM 0,044 – 0,111	547 m <sup>3</sup>
z toho: I. a II. třída těžitelnosti	223 m <sup>3</sup>
III. třída těžitelnosti	324 m <sup>3</sup>

Datum: 15.5.2023  
Zaměřil: R. Hanousek, R. Dvořák  
Vyhotovil: Ing. M. Hořejší ml.



Digitálně podepsal  
Ing. Miroslav  
Hořejší  
Datum: 2023.05.15  
11:42:35 +02'00'

Převzal:

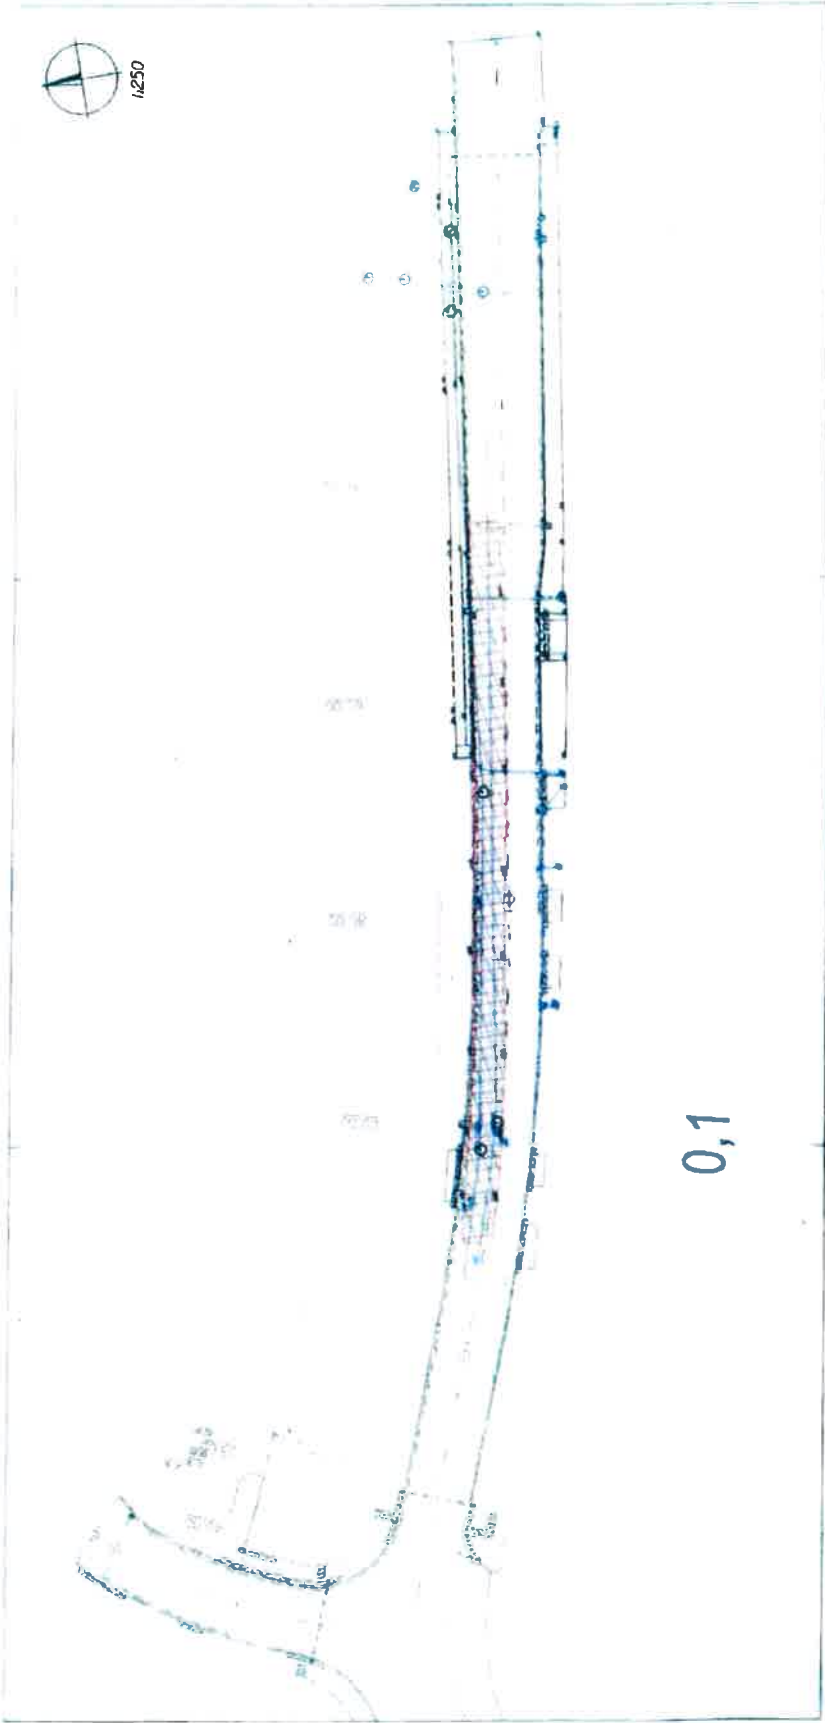

0,1

## Předávací protokol č. 3

Stavba: REKONSTRUKCE SIL II/161 A II/163 V PRÚTAHU MĚSTA VYŠŠÍ BROD

Objekt: SO 303, 305

Na základě geodetického měření ze dne 10.5. za účasti geologa stavby byly zaměřeny kubatury výkopů SO 303 a SO 305 v KM 0,121 – 0,148.

kubatura výkopu v KM 0,121 – 0,148	174 m <sup>3</sup>
z toho: I. a II. třída těžitelnosti	84 m <sup>3</sup>
III. třída těžitelnosti	90 m <sup>3</sup>

Datum: 17.5.2023

Zaměřil: R. Hanousek, R. Dvořák

Vyhotovil: Ing. M. Hořejší ml.



Digitálně podepsal


Ing. Miroslav

Hořejší

Datum: 2023.05.17

11:45:12 +02'00'

Převzal:

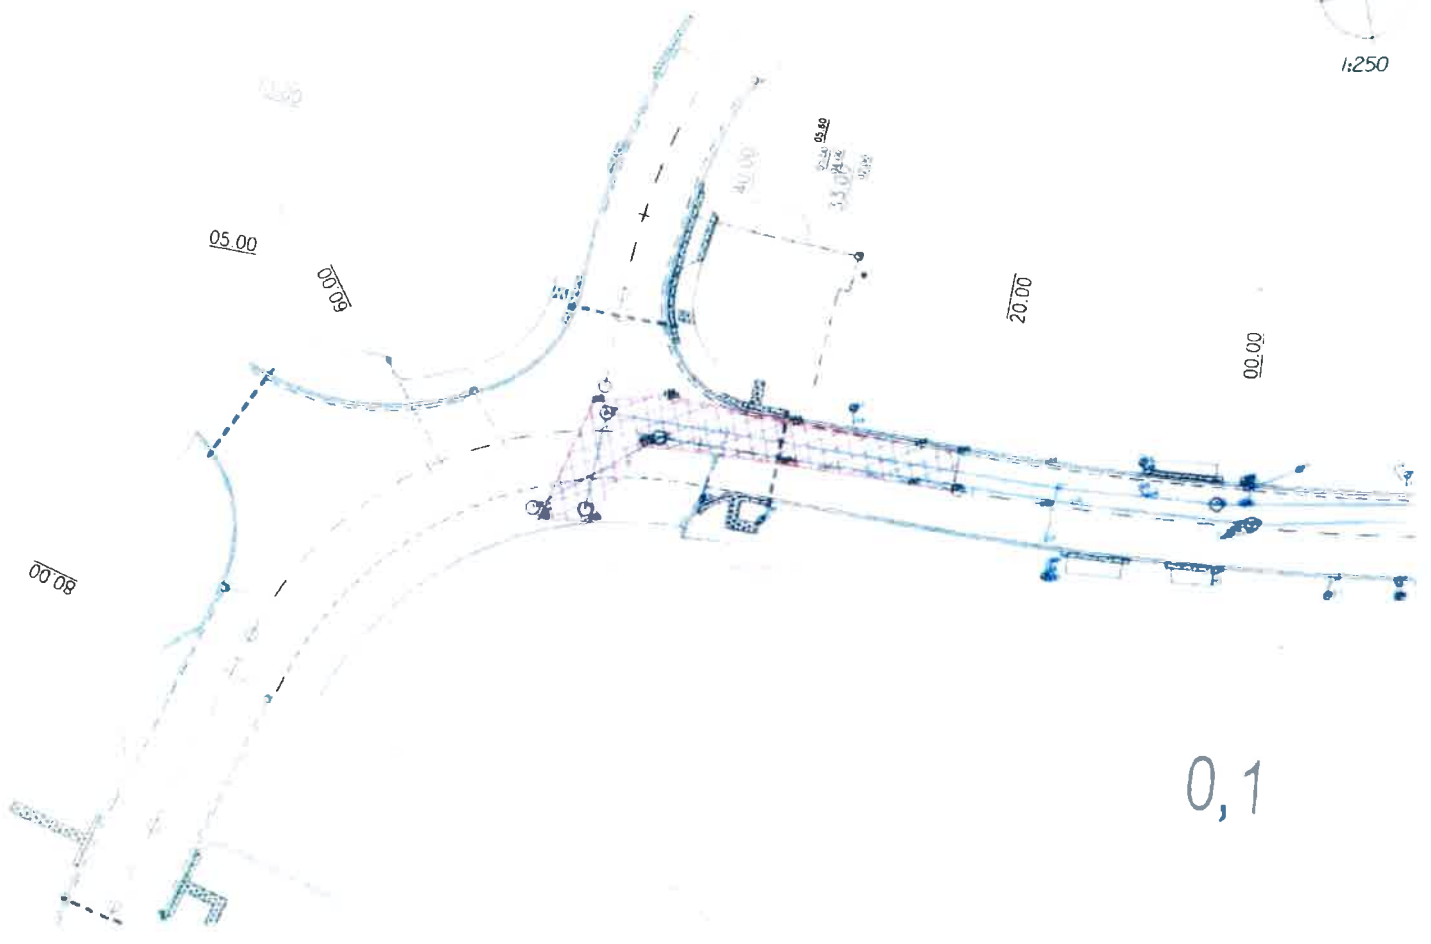

0,1



Nákladové středisko: PAKV      Název akce: 1/161 a 1/163      Datum: 23.3.23      Den týdne: ~~čt~~

Počasí: 8°C - 15°C      460T BRD

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>

Pracovníci (jména a příjmení): PTP. LADISLAV KONNEN      Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup>

HEV, ROZ SNOLEN, JAN SNOLEN, JARNA VRSNICE  
NICHAV MAJENAV, KONINKA ZABA, MILAN PLETNODA, PAVEL LNOUEN  
600 POKRYVKA k

Mechanismy: BOBČAT S 600 - STRABAG  
TRAVERTI TB 260 - ..  
HALS NETA ..  
T 815 - POKRYVKA  
KONTAKT 138 \*

Material: PVC, ŠP

Rošky: TPA - HURTY REF. MOCNÝ V KW. 0,292 AS 60 101  
II/161 - FAKEL STRABAG  
- LDEBKA, ZÁSTUP. KANALIZACE 60 203, 305

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- 60 203
- MĚROU PRO ROUBY DN 400 Š26 - Š3 = ODLOŽ NA KLADBU
- POLOŽENÍ ROUBY DN 400 Š26 - Š3 60 ŠP LOTE - OBČYP,
- ZÁSTUP. VETNINU, MĚTIVENÍ - 12.1
- MĚLENÍ MĚROU
- MONTÁŽ ROUB PVC 160 PRO UVĚ. 1 0,016 50      OBČYP +
- UBČYP
- V KW. 0,045 SKALNĚ PODLOŽÍ, MĚROU MDR. KLADBY.
- 60 02- KONTROLA DO, 202 ZÁVAD
- BĚŽNĚ O PŘEVZETÍ ROUB DN 400 Š26 - Š3 60 203 včetně lote h.
- 60 02

KONTROLA PŘEKRYTKU - V POKRYTKU.

zápisce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Nákladové středisko: HAKV      Název akce: 1161 + 1163 MEST BRON      Datum: 24.3.24      Den týdne: PA -

Počasí: 8°C - 12°C

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup>

Pracovníci (jména a příjmení): M.P. LADICAN HONNER, JAIKUB VEGUNEC      Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup>

PETE GNOLAN, DAN GNOLAN, DANIEL GNOLAN, MILAN PETROVIC  
DOMINIK ZABO, NICHAN BILUTIL  
SBO. POZEMKA

Mechanismy: 30041-S 450- STRABAG  
DALT NDEJ -.-  
FLAVERTI -.-  
P810- POLETRNA  
KONTAKT 158 -.-


Material: PVC, OP

Zkoušky:

Provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- SO 02 - KONTROLA D10, BAZE ZAVRHO
- SO 303 - MKOP PRO ROUVY, ODVOD VERTIKAL NA SKLADKY
- POLOŽENÍ ROUVY PVC DN 400 + ODB 400/150 UV2 DO ŠP LOZE  
H. 10 CN, ODBYR ŠP, AŽYR VERTIKAL, NURNERT, ADLIE, BODLEJIT  
MKOPU  
NERNITĚ ROUVR PVC 150 UV2 DO ŠP LOZE, ODBYR, 184P
- V k.m. 0,050 NALAZENO STALNĚ PODOŽITĚ KE MKOPU KVALIZACE  
SO 303, BOURANÍ HYDRAULICKY KALIVETI.

- ZÁPIS O PŘEVZETÍ ROUVY PVC DN 400 VĚTNĚ LOZE 10 CN ŠP  
SBO- ES CO 303.

HONNER 

KONTROLA POKLADKY POTRUBÍ - A POŘÁDKU.

Zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Nákladové středisko: WA+V      Název akce: V/161 + R/163      Datum: 27.3.23      Den týdne: Po  
 Počasí: 4°C + 6°C  
 Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 17<sup>00</sup>      Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup>  
 Pracovníci (jména a příjmení): TRP. LADISLAV KONNOR, JAKUB VREBNÍK  
PAV. PELE ŠNOUEN, PAVEL ŠNOUEN, IAN ŠNOUEN, DOMINIK ŠNOUEN  
NICOLA MANZOU, MILAN PEŠTODA, PR. VALIČEK

Mechanismy: ABO. POKRÝVA 3x      KOMATIV PE 138 - POKRÝVA  
BORGAT S CSO - VREBÁTK  
HALT NISI  
BEVUCH T3 220  
HALT NISI - VREBÁTK

Materiál: 3D, PVC

poznámky:

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- SO 02 - kontrola DIO, BSE zóna
- SO 01 - SKALNĚ POKRÝV V KLOUCE 0,9 m POD POVRCHOVÝ ASFALT. PŘÍKOP PRO DRENÁŽI + ODVOD ŽSTINY NA SKALNĚ POKRÝV DRENÁŽI ROUBEN DN 110 0,05 - 0,045 PS, OBSA 3T 8/16, LAMPA - KUTNĚB, NAPĚČENÍ SO ROUBEN PVC-150 UV1.

Zápis geodetického zhotovitele:

Dva bylo provedeno geodetické práce zúčastnění zeminy v území pro SO 303 a SO 305 v území mezi 51-52. Ve výšce byly zprovozněny zeminy I. až III. třídy rekonstrukce podle č. 73 6133.

- Úroveň n. 24, 0,02 je uvažována:
- I. třída (horiz. pás, páska stěr), zebra směrně koruny
  - II. třída (korun 24)
  - III. třída (korun 23, 22), se vzdáleností důstojnost nad 250 mm

Ve PSN 73 6133 a dle uvažovaného geodetického zhotovitele je zprovozněna jednotlivých tříd uvažovaná:

- I. třída 60% zprovoznění zeminy
- II. třída 5% zprovoznění zeminy
- III. třída 35% zprovoznění zeminy

Pro zprovoznění zeminy I. a III. třídy je nutné zprovoznit páska koruny stěr. Použít se musí třída III. s dostatečným profilem výš.

zástupce investora (OI):

za OI č. Michal NOVÁK S.Š.      Podpis stavbyvedoucího: [Signature]  
Autonomní geodetické zhotovitel

BRKO MA/16/2023

Nákladové středisko: **NAKV**      Název akce: **II/161 a I/163 Městský obvod**      Datum: **29.3.23**      Den týdne: **ÚT**

Počasí: **28+ B<sup>o</sup>**

Pracovní doba: **7<sup>h</sup> - 15<sup>h</sup>30**

Pracovní přestávka: **11<sup>h</sup> - 11<sup>h</sup>30**

Pracovníci (jména a příjmení): **Mgr. Ladislav Konečný, Jaroslav Vrbánek**

**Mgr. Pavla Šmolová, Dana Šmolová, Jan Šmolová, Dominik Žába, Petr Křeml, Žába, Milan Petráček, Petr Václavík**

Mechanismy:	<b>S&amp;P - POKRYVA 3x</b>	<b>KONSTRUKCE 13B - POKRYVA</b>
	<b>BOREKAT &lt; 650 - STRABAG</b>	<b>13B</b>
	<b>TABULEK 13 260 7.</b>	<b>KOLO 140 MK</b>
	<b>PRÁČÍ 130</b>	

Materiál: **SD, DP, PVC**

Koušky:

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- SO 02 - kontrola DIO, BSL závad

- SO 303 - HROP PŘI ROUBENÍ DN 400 - ODVOS NA SKLADĚNÍ

POLOŽENÍ ROUBENÍ DN 400 DO ŠP 1025 PL 10C4, OBEČP, ZÁČEP ŽENIKOV

MURÁKŮ, PRÁČENÍ HROPŮ 526-53

- MONTÁŽ 2x OBEČENÍ DN 400/160 PŘI UV 3 + P1, MONTÁŽ ROUBENÍ DN 160 PVC

VP. - HROP V SO 303 ZA POMOCI HYDRAULICKÉHO KLADIVA, ODLAHOVÁNÍ SKALNINŮ PODLOŽÍ - HORNŮV

- DODATEK O PŘEVÝŠENÍ ROUBENÍ DN 400 526-53 VĚŠNĚ ŠP 1025, OBEČP A ZÁČEP SO 303.

HORNŮV

KONTROLA PORADKY PŮTRUBÍ - PORADKY.

Zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Nákladové středisko: HAKV      Název akce: 1/101 + 1/103      Datum: 29. 3. 23      Den týdne: ŠT  
 Počasí: - 7°C + 16°C      MÍSTO PRÁCE  
 Pracovní doba: 7<sup>00</sup> + 16<sup>00</sup>      Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup>  
 Pracovníci (jména a příjmení): TYP. LADISLAV HONKOVSKÝ, IRENE VŘEŠŇÁK  
 MIV. PŘEV. STOLEN  
 SBD. POČETNÁ 32.

Mechanismy: ZOBENT 3 630 - STRABAG  
 BS - POČETNÁ  
 KONATN PU 38 - POČETNÁ  
 VOLVO 40 HK - -2

Material: ŠD, ŠD, PR

Koušky:


Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- S02 - ROZVEDENÍ KABELŮ - KONTROLA.


S0 202 - PŘEV. MIV. ROVĚNÍ NA 400 - ROZVEDENÍ NA SKŘÍTKU  
 ROZVEDENÍ ROVĚNÍ NA 400 DO ŠD LOŽE, OBSYP ŠP, ZÁŠTĚBENÍ  
 MONTÁŽNÍ, PŘEV. MIV. Š26-Š3

VP. PŘEV. ZA PONDÍ HYDRAUL. ČIŠTIVA, ODLIHOVÁNÍ ČIŠTIVA POČETNÁ  
 KONTROLA SEAL. POČETNÁ - 09 - 3,1 D POD NIVELOVOU KOMUNIKACE

- ZÁPIS - ZPRÁVA O PŘEV. ROVĚNÍ NA 400 Š26-Š3 - S0 202 VĚSTĚ  
 LOŽE ŠP H. 10 EN, OBSYP, ZÁŠTĚBENÍ.

POČETNÁ  


PROVEDENA KONTROLA POČETNÁ.



zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:



Nákladové středisko: HAKV      Název akce: 1/161 + 1/163      MÍSTO PRÁCE: MĚSTSKÝ ÚŘAD      Datum: 31.3.23      Den týdne: Pá

Počasí: 0°C + 11°C

Pracovní doba: 7<sup>h</sup> - 14<sup>h</sup>30      Pracovní přestávka: 11<sup>h</sup> - 11<sup>h</sup>30

Pracovníci (jména a příjmení):  
TYP: LADISLAV HONNISTU, KAREL VEŠNÍK  
M.P.: PAVEL ŠNOUW, PAVEL ŠNOUW, IAN ŠNOUW, PE. VALČEK, MIKUL  
HAKV: PAVEL ŠNOUW, DOMINIK BABI  
M.P.: SUŠO, POKRÝVAČ B.

Mechanismy:  
BOBRAT 6 650 - STRABAG      KONATN K 138 - POKRÝVAČ  
HALT NOST      -  
PŘEVODNÍK 160      -  
TBS - POKRÝVAČ  
VOLVO - HE - POKRÝVAČ

Material:  
SO, SP, PVC

Zkoušky:

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

1030 - archeologický dohled výkonu kanalizace  
- fotodokumentace, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

- SO 02 - kontrola DN, 600 mm
- SO 303 - 400 mm DN ROUČNÍ DN 400 826-83 s odvod. na střeš. plochu
- položení ROUČNÍ DN 400 DO SP LOK. K. 10.03, OBSAH, 234P METINOU
- NÁMĚR NÁMĚR NA POMOČI HYD. KONTROLA - SEALUNG PODLOŽI
- od 0,9 - 2,6 m hloubky do uložení komunikace.
- nově odvedení 2x 400/100 mm DN + P3

- 24615 - práce o přeměně ROUČNÍ DN 400 včetně 1075, OBSAH SP  
234P SO 303 826-83 HONNISTU

KONTROLA POKRYVKY POTRUBÍ - V PORÁDKU.

Zástupce investora (TI):

Podpis stavbyvedoucího:

Nákladové středisko: HAKV      Datum: 25.4.23      Den týdne: ÚT  
 Název akce: 1/161 + 1/163      MÍSTÍ BRD  
 Počasí: 7°C + 11°C      DEŠT.  
 Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 16<sup>30</sup>      Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup>  
 Pracovníci (jména a příjmení): TYP: LAPISLAN KONWIEN, JAKUB VŘEŠTE  
 BEV. PAVEL ŠTOLAN, JAN ŠTOLAN, PETE ŠTOLAN, MILAN PETROČEK, NORFIN  
 SOUVP, JAN BUDVĚR, TR. KALČEK  
 SOB. POKRÝVKA 3.

Mechanikami: BOBEK S 650 - STRABAG      VOLVO - POKRÝVKA  
 NB PREGO      + -      MBUS - +  
 PRAVÍ PREGO      +      KONATEL 138 - +  
 TRAVELER 10 260      +

Materiál: PVC, ŽP, KETIPLA

Koučky:

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

930 - archeologický dohled na území kanalizace a skryté  
 silnice (měření & měření), fotodokumentace

- SO 303 - NĚPŘ PRO KANALIZACI 33-34 + COVOZ NA SKRABU, NĚPŘ  
 POMOCI MPR. KLADIVA (VOLVO), NĚPŘÉ SOUVP PVC 400 + COVOZ  
 P4 - B5, OBYP ŽP, LOŽE ŽP, NĚPŘ SE UNIKÁTEM  
 - ODLIHOVNÍ RYBY - STAN. PODLOŽÍ - VĚTRÁČE

- DOPRAVA O PĚŠINĚ SOUVP DN 400 - 33-34 VĚTRÁČE LOŽE, OBYP  
 + NĚPŘ. KANALIZACI

*ad*

KONTROLA POKRÝVKY PĚŠIN. - V PORÁDKU.

pis zástupce investora (TDI)

Podpis stavbyvedoucího:

*[Handwritten signature]*

*ad*

Nákladové středisko: HAKV      Datum: 26. 4. 23      Den týdne: ST  
Název akce: H/161 + 4/163      MĚST BRNO  
Počasí: 7°C - 10°C  
Pracovní doba: 7<sup>h</sup> - 16<sup>h</sup>      Pracovní přestávka: 11<sup>h</sup> - 11<sup>h</sup>  
Pracovníci (jména a příjmení): TPA LADISLAV HONKUS  
PEV. PAVEL ŠNOLEK, PELE ŠNOLEK, JAN ŠNOLEK, PE. VALDICEK, MILAN PETRODA  
PABETLO BOLEKUP, JAN BUCHNĚK  
GSD - FOKOTVKA 2

Mechanismy: BOBEAT 6 GSD - STANOK  
VALBUCH 200      ↓ -  
NB AT20      ↓  
NALI NETA      ↓  
VOLVO 4E - FOKOTVKA  
KONATU      ↓ -  
TBIS      ↓


Material: PE DUVY

Dotazy:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- 60 203 - BOBEAT BTM HYDRAUL. KLADIVEM, DOLANČENÍ  
BTM 1,5 m<sup>2</sup> / PEN - KUPERLE

Js zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:





Datum: 29.4.23 Den týdne: OT  
 Jádřadové středisko: KREV Název akce: 1/161 + 1/163 MEST BRAP  
 Počasí: 3°C - 11°C  
 Pracovní doba: 7<sup>30</sup> - 16<sup>30</sup> Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup>  
 Pracovníci (jména a příjmení): TOP: LADISLAV KONNAR  
 TV: PAVEL ŠNOUJ, TOP ŠNOUJ, JIŘÍ ŠNOUJ, MILAN PEŠVODA  
 PE: VILČEK, MARTIN ŠOUKUP, JIŘÍ NEJEDLÍ  
 ŠD: KOLETVA Š.

Mechanismy: ZDEŠT + ŠD - STRABAG CAT AK - POŠEVKA  
 NA KREV - x FBIS  
 MALÝ NISB - + KONATN ŠB x  
 TRAVUČI +

Materiál: PVC ROVET


Cošky:

Uvedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- 10 203  
 MROP RITNY MUR. KLADIVEN, ODLAHOVNÍ ŠPILY - ODDZ-NH  
 ŠLAFDNU - (VTRAPNUTÉ ŠTALU. PODLOŽI)  
 POLOŽENÍ ROVU DN 400 Š 3-Š4 DO ŠP LOZE, OBLAŠP  
 ŽÁŠYP SE ŽIVNOSTI, POLOŽENÍ ODDZON 400/100 PŠAPS PGB

1.16.1. DĚLÁNÍ O PŘENOSU ROVU DN 400 Š3-Š4 DĚLNĚ LOZE ŠP,  
 OBLAŠP, ŽÁŠYP

KONNAR



PROŠEBUJÍ KONTROLA POŠEVKY - V PRÁČCE.

Podpis zástupce investora (TDI)  Podpis stavbyvedoucího: 

Datum: 26.4.23 Den týdne: Pá

úkladové středisko: HAKV Název akce: 1/161 + 1/162 MĚST BRNO

čas: 0°C - 12°C

pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 14<sup>30</sup>

Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup>

pracovníci (jména a příjmení): TYP. LAPILKA KONNEN

TYP. PAUL ŠNOLEN, PETER ŠNOLEN, JAN ŠNOLEN, TE. VALIČEK, NĀRTU  
SOULUP, PIKAL PŘETOP

SD. POKRYV 2

mechanismy:

BOBAC s SD - STRABAG	ČAT VE - POKRYV
MALT DICT	KONKRETNĚ 138 - +
PE ATZEO	185 - +
TRAFIKUM 260	

materiál:

PE ROUBA


poznámky:

vedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- SO 203 - PŘÍPRAVA PODLAHY PODLAŽNÍHO ETÁŽE. KLADIVA, ODLANOVÁNÍ ČERNY  
+ UPOZ. NA SKLADY, POKRYVKA ROUBA PE DN 400 DO SP 102  
OBSYP, OBSYP SE ZHUTNĚNÍ, P

zápis. zpráva o provedení rouba DN 400 SO 203 z 3-04 včetně  
obrysu, kote SO

konstrukce




PROVEDENA KONTROLA POKRYVKA PODLAŽNÍ

za zástupce investora (TDI):



Podpis stavbyvedoucího:



Nákladové středisko: TRAVY      Datum: 29.4.23      Den týdne: SO  
 Název akce: 1/181 + 1/160 MŠDT BRNO  
 Počasí: 5°C, 15°C  
 Pracovní doba: 7<sup>h</sup> - 15<sup>h</sup>      Pracovní přestávka: 11<sup>h</sup> - 11<sup>h</sup>  
 Pracovníci (jména a příjmení): TDP. LADISLAV HONNEN  
TRV. PAVEL ŠNOUPEL, PAVEL ŠNOUPEL, MILAN METIHOVA, PAVEL ŠNOUPEL  
STAV. FOKROVKA Z

Mechanismy: BOBCAT 6 GSD - STRABAG      T85 - FOKROVKA  
OB APECO      CAT HK  
HAUT PEG      KONATN PEG  
ATKUSCH 260

Materiál: PEC, CP


loučky:

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- LO 303,  
PRKOP BETHY PONDOL HK, ODLANOVÁNÍ STROMŮ, ODLUŽ NÁ CELADKY  
POKLADKA ROVR DU 400 ŠS-ŠT, POUŽITÍ ODBOČEK PEG, PZ  
400/150, PEC - VÍČKOVKA  
LODE SP H, LO CI, OBYP CP, ZÁSTUP K ZAHRADEK

ZAPIS -


DRŽENÍ O PŘEVZETÍ ROVR DU 400 ŠS-ŠT VČETNĚ LODE SP,  
OBYP.

HONNEN 

PROVEDBA KONTROLA POKLADKY - V POKLADKY.

his zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:



Datum: 30.4.23 Den týdne: NE  
základové středisko: 1142V Název akce: 1/161 + 1/162 HSEF SMOO  
čas: 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>  
pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 14<sup>00</sup> Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 11<sup>00</sup>  
pracovníci (jména a příjmení): TTP. LAPIDAN KONUCR  
M.V. PETE STOLAN, MIKA PETROVA  
S.B.D. POKREVA 3x



technismy: 20247 & 250 - 20247 780 - 20247  
20247 280 + CAT 42 - +  
20247 280 + KONATEV 108 +

materiál: PC, CP

poznámky:

ověřené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- 60 02 - KONTROLA DIO, HSE ZÁVAD
- 50 003 - HROP PRO ŽACENÍ 33 PONOŘI HROP. KLADIVA, OBLANOVANÍ  
6244, OVOB NA KUPCEK, HROVAVI VETINY PO VESNARU 25 07  
B 5-54.

pis zástupce investora (TDP)  Podpis stavbyvedoucího: 

Vákladové středisko: Hřeky Název akce: 1/161 + 1/162 HEST BRAD Datum: 6.5.23 Den týdne: So

Počasí: 10°C - 18°C

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 14<sup>30</sup>

Pracovníci (jména a příjmení): Typ. Ladislav Kowalec, Jakub Věžník Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup>

ŘTV: Petr Šnourek, Jan Šnourek, Petr Kautel, Pr. Vaclavěk, Martin

ČSD: Pokropek 2

Mechanismy	BOBCAT L 600 - STRABAG	TRIS - POKROPEK
TRAKTOR 260	-x	KONTYNER 38 - x
NA ATRIO	-x	
NALÁ NEZ	-x	

Materiál: 30, 50, 100, ...

Zkoušky:

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činnosti):

- 30 ov kontrola DIO, bez záhad  
 - 30 ov, práce pro budoucí práci ukázková, odlanování skal,  
 práce 54-55, kontrola roviny DN 400 s odbočkou 400/150  
 DN 60 kote 8P, obsyp, zářez, práce sL PUNU, vodováhu,  
 práce 6000 + LV. (brzdění motorů), práce 0,12B - 0,14B  
 odlanování 0,121 - 0,12B

- začátek o převzetí roviny DN 400 s 4-35 včetně 6P kote 1  
 obsyp. kontrola



zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího:

Základové středisko: **NAKV**      Název akce: **1/161 + 1/163 HBSF 0200**      Datum: **3.5.23**      Den týdne: **NE**  
 Měsíc: **11<sup>00</sup> + 18<sup>00</sup>**  
 Pracovní doba: **7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>**      Pracovní přestávka: **11<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup>**  
 Pracovníci (jména a příjmení): **TRP. LADISLAV KONNKA**  
**TRV. PAVEL ŠKOLEN, PR. VILÉMEK, MILAN PESTYDA**  
**SDO. POLOBEK 2**

Mechanismy: **BOBCAT S 6SD - 4110006**      **TRV - POLOBEK**  
**NAK NISK**      **+**      **KONNKA - 1 -**

Materiál: **SD, CP, DC**

Použité:

provedené práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

- 60 02 KONTROLA DIO, 200 ZAVAD
- 60 505 HROP PRO ROUPEY DN 400 84-28, OPUCI VETINY NA ZELABEU, STIZENE VTEOPRAVY, ROUKOVANI DEKALVATRO POKROBT
- HROP POMOCI HROP. KLADIVA, kv. 0,128 - 0,148
- ROUKOVI ROUK DN 400 DO 30 LOC, OBSTA, VETIP.
- 60 101 - HNEVA POKROBT V kv. 0,080 - 0,160 0/115 SD HUPROVI, VPRVA MENE DUS PE.

za zástupce investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího: 

Adresné středisko: PRAHA      Název akce: 1/161 + 1/163 MĚSTĚ TRDOP      Datum: 8. 5. 2013      Den týdne: PO

Stav: 5°C + 8°C

Pracovní doba: 7<sup>00</sup> - 15<sup>00</sup>

Pracovní přestávka: 11<sup>00</sup> - 11<sup>30</sup>

Osoba (jména a příjmení): PAVL UDÍLKA KONJASTR

HEV. PAVLA ŠTOLEN, PEŠE ČHOLOU, JAN ŠTOLEN, MARTIN ŠTOLEN  
MARTIN ŠOUKUP, PE. VĚŠČEK

SBD. POKEJTEVA BR

Práce:

BOJČAT J 650	-	STRABAG	CAT HE.	-	POKEJTEVA
TRKUCHI 200	+		PEŠE	+	
PEŠE 4-PEŠE	-		KONJASTR 100	+	
PAVL NČK	+				


SD, SP, AVC

Práce (včetně dodavatelů a jejich činností):

so 305 - MROP PONOČI MPR. ELKALIT, POLANOVČEK 62704  
Kč 0,128 - 0,148 - 34-35.

Podpis investora (TDI):

Podpis stavbyvedoucího



č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/283/22  
č. tohoto dodatku: SDL/ODSH/076/283/2

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/HD/22/20  
č. tohoto dodatku:

## DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 250000302/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**MUDr. Martin Kuba**, hejtman Jihočeského kraje  
Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:  
**JUDr. Andrea Tetourová**, vedoucí ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje,  
tel. č. 386 720 132  
Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:  
**Ivana Schwarzová**, investiční technik ODSH Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386 720 106

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.  
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČO: 608 38 744  
DIČ: CZ60838744  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 3505231/0100  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634  
Zastoupená: Janem Michalcem, technickým vedoucím oblasti, tel. č. 602 596 308  
Václavem Beranem, vedoucím OTÚ oblasti, tel. č. 602 596 308  
Odpovědný geodet: Ing. Radim Mikula, tel. č. 777 822 563  
Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):  
Jan Křížovský, tel. č. +420 602 567 986  
Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):  
Ladislav Honner, tel. 602 157 631  
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Tomáš Váca, DiS., tel. č. 606 726 209  
který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací,  
k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

**„Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“**

### II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/ODSH/283/22 ze dne 15. 7. 2022 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce silnice**



**II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod“** (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění **čl. III. Doba plnění**, odst. 1, bod b a dále **čl. IV. Cena za dílo**, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

**Původní znění čl. III. Doba plnění** odst. 1, bod b smlouvy o dílo:

Termín pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 351 kalendářních dnů od dne předání a převzetí staveniště (+zimní technologická přestávka).

**Nové znění čl. III. Doba plnění** odst. 1, bod b smlouvy o dílo:

Termín pro dokončení stavby ve smyslu ust. § 2605 občanského zákoníku: do 391 kalendářních dnů od dne předání a převzetí staveniště (+zimní technologická přestávka).

**Původní znění čl. IV. Cena za dílo** odst. 1 smlouvy o dílo:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	31 457 640,04 Kč
DPH 21 %	6 606 104,41 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>38 063 744,45 Kč</b>

**Nové znění čl. IV. Cena za dílo** odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a změnového listu č. 3,4 a 5:

celkem bez DPH	32 535 352,22 Kč
DPH 21 %	6 832 423,97 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>39 367 776,19 Kč</b>

### **III. Závěrečná ustanovení**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou změnové listy č. 3,4 a 5 odsouhlasené objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1250/2023/RK-79 ze dne 23. 11. 2023.

V Českých Budějovicích dne  
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne  
za zhotovitele:

.....  
MUDr. Martin Kuba  
hejtman Jihočeského kraje

.....  
STRABAG a.s.  
Jan Michalec, technický vedoucí oblasti

.....  
STRABAG a.s.  
Václav Beran, vedoucí OTÚ oblasti

Stavba : Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod  
Investor : Jihočeský kraj, České Budějovice  
Projektant : ATELIER SIS, U Malše 20, 370 01 České Budějovice  
TDS : Milošlav Jindra  
Zhotovitel : STRABAG a.s.

## REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

OBJEKT	ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3		ZMĚNOVÝ LIST č.4		ZMĚNOVÝ LIST č.5		
	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3	Změnový list č.4	Celk.cena po změně č.4	Změnový list č.5	Celk.cena po změně č.5
S.O. 02	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47	0,00	958 666,47
S.O. DIO	494 463,88	0,00	494 463,88	0,00	494 463,88	0,00	494 463,88	0,00	494 463,88	168 551,78	663 015,66
S.O. 101	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24	0,00	27 391 289,24
S.O. 303	2 275 380,02	-17 066,95	2 258 313,07	180 541,59	2 438 854,66	542 000,65	2 980 855,31	203 685,16	3 184 540,47	0,00	3 184 540,47
S.O. VN-OOT	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43	0,00	337 840,43
Haléřové vyrovnání											-0,04
<b>CENA STAVBY BEZ DPH</b>	<b>31 457 640,04</b>	<b>-17 066,95</b>	<b>31 440 573,09</b>	<b>180 541,59</b>	<b>31 621 114,68</b>	<b>542 000,65</b>	<b>32 163 115,33</b>	<b>203 685,16</b>	<b>32 366 800,49</b>	<b>168 551,78</b>	<b>32 535 352,22</b>
DPH 21%	6 606 104,41	-3 584,06	6 602 520,35	37 913,73	6 640 434,08	113 820,14	6 754 254,22	42 773,88	6 797 028,10	35 395,87	6 832 423,97
<b>CENA VČETNĚ DPH</b>	<b>38 063 744,45</b>	<b>-20 651,01</b>	<b>38 043 093,44</b>	<b>218 455,32</b>	<b>38 261 548,76</b>	<b>655 820,79</b>	<b>38 917 369,55</b>	<b>246 459,04</b>	<b>39 163 828,59</b>	<b>203 947,65</b>	<b>39 367 776,19</b>

HONNOST  





**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kacírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(323)

Stavba : Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod  
číslo a název SO: 303 - Kanalizace dešťová

## ZMĚNOVÝ LIST č.3

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA		Rozdíl celk. ceny	
							celkem	bez DPH	celkem	bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	
<b>VÍCEPRÁCE</b>										
13	132553253 - nová	13 Zemní práce - hloubené vykopávky	M3	0,000	88,580	88,580	0,00	124 012,00	124 012,00	124 012,00
	139001101 - nová	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojně v omezeném prostoru	M3	0,000	142,871	142,871	0,00	78 007,57	78 007,57	78 007,57
	138611201 - nová	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	0,000	54,291	54,291	0,00	351 805,68	351 805,68	351 805,68
	nová	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 7	KPL	0,000	0,340	0,340	0,00	32 702,27	32 702,27	32 702,27
		Geometrické zaměření kubatur					0,00	586 527,52	586 527,52	586 527,52
		Vícepráce celkem					0,00	123 170,78	123 170,78	123 170,78
		DPH 21 %					0,00	709 698,30	709 698,30	709 698,30
		<b>CELKEM vč. DPH</b>								
		<b>MĚNĚPRÁCE</b>								
13		13 Zemní práce - hloubené vykopávky								
6.	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000	KUS	363,980	292,545	-71,435	111 123,09	89 313,99	-21 809,11	-21 809,11
7.	132354206	Hloubení zapážených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000	KUS	363,980	292,545	-71,435	115 752,92	93 035,16	-22 717,76	-22 717,76
		Měněpráce celkem					226 876,01	182 349,15	-44 526,86	-44 526,86
		DPH 21 %					47 643,96	38 293,32	-9 350,64	-9 350,64
		<b>CELKEM vč. DPH</b>					274 519,98	220 642,47	-53 877,51	-53 877,51
		<b>Bilance (více a méněpráce) za SO 303</b>					226 876,01	768 876,67	542 000,65	542 000,65
		DPH 21 %					47 643,96	161 464,10	113 820,14	113 820,14
		<b>CELKEM vč. DPH</b>					274 519,98	930 340,77	655 820,79	655 820,79

Schválili:	podpis :	datum :
zadavatel: Jihočeský kraj		27.11.2023
TDS: Miloslav Jindra		2.11.2023
Zhotovitel: STRABAG a.s.		
Projektant: ATELIER SIS		
Ing. František Stráský		



STRABAG a.s.  
Kacírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744  
(336)

## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 3

### 1) Změnový list č. 3 - přípočty stavby:

SO 303 - při realizaci dešťové kanalizace v úseku km 0,186 - 0,238, km 0,276 - 0,297 a km 0,361 - 0,421 bylo po odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 0,7 - 1,1 m pod niveletou silnice zjištěno skalnaté podloží, které bylo na základě posouzení geologa zaříděno do jiných tříd než bylo v PD. Po vyznačení jednotlivých vrstev geologem byly tyto vrstvy následně zaměřovány a vyznačeny dle tříd těžitelnosti. V části výkopů bylo provedeno dolamování skalnatého podloží.

### 2) Změnový list č. 3 - odpočty stavby:

SO 303 - při realizaci dešťové kanalizace v úseku km 0,186 - 0,238, km 0,276 - 0,297 a km 0,361 - 0,421 bylo po odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 0,7 - 1,1 m pod niveletou silnice zjištěno skalnaté podloží. Ve výkazu výměr byly použity položky pro hloubení rýh v hornině třídy těžitelnosti skupiny I a II, které bylo na základě posouzení geologa zaříděno do jiných tříd těžitelnosti a proto tyto položky byly odečteny.

3)

4)

5)

Stavba : Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod  
 číslo a název SO: 303 - Kanalizační dešťová

ZMĚNOVÝ LIST č.4

Poř. číslo a názvy položky	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	CENA	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>VICEPRÁCE</b>										
13	132553253 - nová	13 Zemní práce - hloubené vykopávky	M3	0,000	33,559	33,559	1 400,00	0,00	46 982,60	46 982,60
	139001101 - nová	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 100 m3 strojné v omezeném prostoru	M3	0,000	54,128	54,128	546,00	0,00	29 553,89	29 553,89
	138611201 - nová	Příplatek za ztížené vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	0,000	20,569	20,569	6 480,00	0,00	133 287,12	133 287,12
	nová	Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tříd těžitelnosti III skupiny 7	KPL	0,000	0,340	0,340	31 562,00	0,00	10 731,08	10 731,08
		Geodetické zaměření kubatur								
		<b>Vícepráce celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>220 554,69</b>	<b>220 554,69</b>
		<b>DPH 21 %</b>						<b>0,00</b>	<b>46 316,48</b>	<b>46 316,48</b>
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>0,00</b>	<b>266 871,17</b>	<b>266 871,17</b>
<b>MENĚPRÁCE</b>										
13		13 Zemní práce - hloubené vykopávky								
6.	132251256	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000	KUS	363,980	336,916	-27,064	305,30	111 123,09	102 860,45	-8 262,64
7.	132354206	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 1 000	KUS	363,980	336,916	-27,064	318,02	115 752,92	107 146,03	-8 606,89
		<b>Méněpráce celkem</b>						<b>226 876,01</b>	<b>210 006,48</b>	<b>-16 869,53</b>
		<b>DPH 21 %</b>						<b>47 643,96</b>	<b>44 101,36</b>	<b>-3 542,60</b>
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>274 519,98</b>	<b>254 107,84</b>	<b>-20 412,13</b>
		<b>Bilance (vice a manépráce) za SO 303</b>						<b>226 876,01</b>	<b>430 561,17</b>	<b>203 685,16</b>
		<b>DPH 21 %</b>						<b>47 643,96</b>	<b>90 417,85</b>	<b>42 773,88</b>
		<b>CELKEM vč. DPH</b>						<b>274 519,98</b>	<b>520 979,01</b>	<b>246 459,04</b>

Schválili: \_\_\_\_\_ podpis : \_\_\_\_\_ datum : \_\_\_\_\_

zadavatel : Jihomoravský kraj

TDS : Miloslav Jindra

Miloslav Jindra

zhotovitel: STRABAG a.s.

Ladislav Honner

Projektant: ATELIER SIS

Ing. František Stráský



STRABAG a.s.  
 Kacířkova 962/4, 158 00 Praha 5  
 IČ: 60838744  
 (336)

## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 4

### 1) Změnový list č. 4 - přípočty stavby:

SO 303 - při realizaci dešťové kanalizace v úseku km 0,420 - 0,463 bylo po odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 0,7 - 1,1 m pod niveletou silnice zjištěno skalnaté podloží, které bylo na základě posouzení geologa zatříděno do jiných tříd než bylo v PD. Po vyznačení jednotlivých vrstev geologem byly tyto vrstvy následně zaměřovány a vyznačeny dle tříd těžitelnosti. V části výkopů bylo provedeno dolamování skalnatého podloží.

### 2) Změnový list č. 4 - odpočty stavby:

SO 303 - při realizaci dešťové kanalizace v úseku km 0,420 - 0,463 bylo po odtěžení konstrukčních vrstev v tl. 0,7 - 1,1 m pod niveletou silnice zjištěno skalnaté podloží. Ve výkazu výměr byly použity položky pro hloubení rýh v hornině třídy těžitelnosti skupiny I a II, které bylo na základě posouzení geologa zatříděno do jiných tříd těžitelnosti a proto tyto položky byly odečteny.

3)

4)

5)

Stavba : Rekonstrukce silnice II/161 a II/163 v průtahu města Vyšší Brod  
 číslo a název SO: **SO 02 Požadavky objednatel**

## ZMĚNOVÝ LIST č.5

Por.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě jednotek	Množství po změně jednotek	Rozdíl množství jednotek	Cena	Celk.cena ve smlouvě bez DPH celkem	Celk.cena po změně bez DPH celkem	Rozdíl celk. ceny bez DPH celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00		<b>VÍCEPRÁCE</b>								
9		00-DIO-et.0 Dopravné inženýrské opatření - 0. etapa								
		Ostatní konstrukce a práce								
2	914001.R	ZHOTOVENÍ POLEPU ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI	KUS	0,000	3,000	3,000	92,21	0,00	276,63	276,63
4	914132.2	DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,000	13,000	13,000	44,26	0,00	575,38	575,38
5	914139	DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S PŘESUNEM	KSDEN	0,000	182,000	182,000	2,95	0,00	536,90	536,90
8	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S PŘESUNEM	KUS	0,000	14,000	14,000	29,51	0,00	413,14	413,14
9	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA	KSDEN	0,000	196,000	196,000	1,48	0,00	290,08	290,08
10	915111	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNE - MONTAZ S PŘESUNEM	M2	0,000	30,000	30,000	307,38	0,00	9 221,40	9 221,40
11	916112	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNE - NAJEMNE	KUS	0,000	3,000	3,000	98,36	0,00	295,08	295,08
12	916119	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PŘESUNEM	KSDEN	0,000	3,000	3,000	30,74	0,00	92,22	92,22
13	916122	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ	KUS	0,000	3,000	3,000	147,54	0,00	442,62	442,62
14	916123	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KUS	0,000	3,000	3,000	98,36	0,00	295,08	295,08
15	916129	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PŘESUNEM	KSDEN	0,000	42,000	42,000	73,77	0,00	3 098,34	3 098,34
18	916322	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,000	2,000	2,000	44,26	0,00	88,52	88,52
19	916323	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KUS	0,000	2,000	2,000	29,51	0,00	59,02	59,02
20	916329	DOPRAVNI ZABRANY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PŘESUNEM	KSDEN	0,000	28,000	28,000	4,43	0,00	124,04	124,04
21	916362	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PŘESUNEM	KUS	0,000	10,000	10,000	29,51	0,00	295,10	295,10
22	916363	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,000	10,000	10,000	14,75	0,00	147,50	147,50
23	916369	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	140,000	140,000	2,21	0,00	309,40	309,40
24	916712	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PŘESUNEM	KUS	0,000	25,000	25,000	14,75	0,00	368,75	368,75
25	916713	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - DEMONTAZ	KUS	0,000	25,000	25,000	7,38	0,00	184,50	184,50
26	916719	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	0,000	350,000	350,000	1,48	0,00	518,00	518,00
		Vícepráce za část						0,00	17 631,70	17 631,70
01		01-DIO-et.1 Dopravné inženýrské opatření - 1. etapa								
9		Ostatní konstrukce a práce								
2	914001.R	ZHOTOVENÍ POLEPU ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI	KUS	0,000	24,000	24,000	92,21	0,00	2 213,04	2 213,04
3	914002.R	ZHOTOVENÍ POLEPU VELKOPLOSNE ZNACKY	KUS	0,000	9,000	9,000	154,92	0,00	1 394,28	1 394,28
4	914132.2	DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTAZ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	0,000	94,000	94,000	44,26	0,00	4 160,44	4 160,44
5	914139	DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTAZ S PŘESUNEM	KSDEN	0,000	2 332,000	2 332,000	2,95	0,00	6 879,40	6 879,40



6	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PREMÍSTĚNÍM	KUS	0,000	9,000	9,000	44,26	0,00	398,34	398,34
7	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KSDEN	0,000	264,000	264,000	5,90	0,00	1 557,60	1 557,60
8	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	117,000	117,000	29,51	0,00	3 452,67	3 452,67
9	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	KSDEN	0,000	2 574,000	2 574,000	1,48	0,00	3 809,52	3 809,52
10	915111	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M2	0,000	6,500	6,500	307,38	0,00	1 997,97	1 997,97
11	916112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNÉ	KUS	0,000	6,000	6,000	98,36	0,00	590,16	590,16
12	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KSDEN	0,000	132,000	132,000	30,74	0,00	4 057,68	4 057,68
13	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	1,000	1,000	147,54	0,00	147,54	147,54
14	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	1,000	1,000	98,36	0,00	98,36	98,36
15	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	22,000	22,000	73,77	0,00	1 622,94	1 622,94
16	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	1,000	1,000	295,09	0,00	295,09	295,09
17	916159	SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	22,000	22,000	295,09	0,00	6 491,98	6 491,98
18	916322	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000	44,26	0,00	88,52	88,52
19	916323	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	2,000	2,000	29,51	0,00	59,02	59,02
20	916329	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	44,000	44,000	4,43	0,00	194,92	194,92
21	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	16,000	16,000	29,51	0,00	472,16	472,16
22	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	16,000	16,000	14,75	0,00	236,00	236,00
23	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLII TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	352,000	352,000	2,21	0,00	777,92	777,92
24	916712	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	175,000	175,000	14,75	0,00	2 581,25	2 581,25
25	916713	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	175,000	175,000	7,38	0,00	1 291,50	1 291,50
26	916719	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	3 850,000	3 850,000	1,48	0,00	5 698,00	5 698,00
		Více práce za část						0,00	50 566,30	50 566,30
02		02-DI-O-01-2 Dopravní, inženýrské opatření - 2. etapa								
9		Ostatní konstrukce a práce								
2	914139	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	1 410,000	1 410,000	2,95	0,00	4 159,50	4 159,50
3	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	135,000	135,000	5,90	0,00	796,50	796,50
6	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	KSDEN	0,000	1 755,000	1 755,000	1,48	0,00	2 597,40	2 597,40
7	915111	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M2	0,000	6,500	6,500	307,38	0,00	1 997,97	1 997,97
8	915112	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNÉ	M2	0,000	6,500	6,500	270,50	0,00	1 758,25	1 758,25
9	916119	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KSDEN	0,000	90,000	90,000	30,74	0,00	2 766,60	2 766,60
10	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	1,000	1,000	147,54	0,00	147,54	147,54
11	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	1,000	1,000	98,36	0,00	98,36	98,36
12	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ	KSDEN	0,000	22,000	22,000	73,77	0,00	1 622,94	1 622,94
13	916153	SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	1,000	1,000	221,31	0,00	221,31	221,31

14	916159	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	0,000	15,000	15,000	295,09	0,00	4 426,35	4 426,35
15	916322	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000	44,26	0,00	88,52	88,52
16	916323	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,000	2,000	2,000	29,51	0,00	59,02	59,02
17	916329	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	30,000	30,000	4,43	0,00	132,90	132,90
18	916362	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	26,000	26,000	29,51	0,00	767,26	767,26
19	916363	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,000	26,000	26,000	14,75	0,00	383,50	383,50
20	916369	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	390,000	390,000	2,21	0,00	861,90	861,90
21	916712	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	185,000	185,000	14,75	0,00	2 728,75	2 728,75
22	916713	DEMONTAZ	KUS	0,000	185,000	185,000	7,38	0,00	1 365,30	1 365,30
23	916719	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	0,000	2 775,000	2 775,000	1,48	0,00	4 107,00	4 107,00
		Vice prace za cast						0,00	31 086,87	31 086,87
03		03-DIO-et.3 Dopravné inženýrské opatření - 3. etapa								
9		Ostatní konstrukce a práce								
1	914001.R	ZHOTOVENI POLEPU ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI	KUS	0,000	5,000	5,000	92,21	0,00	461,05	461,05
3	914133	2 - DEMONTAZ	KUS	0,000	6,000	6,000	29,51	0,00	177,06	177,06
4	914139	DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	3 751,000	3 751,000	2,95	0,00	11 065,45	11 065,45
5	914439	DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	341,000	341,000	5,90	0,00	2 011,90	2 011,90
7	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTAZ	KUS	0,000	6,000	6,000	14,75	0,00	88,50	88,50
8	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE	KSDEN	0,000	3 751,000	3 751,000	1,48	0,00	5 551,48	5 551,48
9	915111	VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKE - DODAVKA A POKLADKA	M2	0,000	6,500	6,500	307,38	0,00	1 997,97	1 997,97
10	915112	ODSTRANENI	M2	0,000	6,500	6,500	270,50	0,00	1 758,25	1 758,25
12	916119	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SAMOSTATNE - NAJEMNE	KSDEN	0,000	42,000	42,000	30,74	0,00	1 291,08	1 291,08
13	916122	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000	147,54	0,00	295,08	295,08
15	916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KSDEN	0,000	2,000	2,000	73,77	0,00	147,54	147,54
16	916152	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	1,000	1,000	295,09	0,00	295,09	295,09
17	916153	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - DEMONTAZ	KUS	0,000	1,000	1,000	221,31	0,00	221,31	221,31
18	916159	SEMAFOROVA PRENOSNA SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	0,000	31,000	31,000	295,09	0,00	9 147,79	9 147,79
19	916322	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	4,000	4,000	44,26	0,00	177,04	177,04
21	916329	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	124,000	124,000	4,43	0,00	549,32	549,32
22	916362	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	7,000	7,000	29,51	0,00	206,57	206,57
23	916363	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTAZ	KUS	0,000	19,000	19,000	14,75	0,00	280,25	280,25
24	916369	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	0,000	217,000	217,000	2,21	0,00	479,57	479,57
25	916712	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTAZ S PRESUNEM	KUS	0,000	175,000	175,000	14,75	0,00	2 581,25	2 581,25
27	916719	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	0,000	5 425,000	5 425,000	1,48	0,00	8 029,00	8 029,00





2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	29,51	0,00	86,53	86,53
3	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLAD VĚL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	0,000	5 110,000	5 110,000	2,95	0,00	15 074,50	15 074,50
4	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	9,000	9,000	29,51	0,00	265,59	265,59
5	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	14,75	0,00	44,25	44,25
6	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNĚ	KSDEN	0,000	5 110,000	5 110,000	1,48	0,00	7 562,80	7 562,80
7	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	0,000	8,000	8,000	307,38	0,00	2 459,04	2 459,04
8	916112	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	2,000	2,000	986,08	0,00	1 972,16	1 972,16
9	916119	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ	KSDEN	0,000	146,000	146,000	30,74	0,00	4 488,04	4 488,04
10	916362	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,000	11,000	11,000	29,51	0,00	324,61	324,61
11	916363	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	11,000	11,000	14,75	0,00	162,25	162,25
12	916369	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	0,000	803,000	803,000	2,21	0,00	1 774,63	1 774,63
16	916713	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	0,000	3,000	3,000	7,38	0,00	22,14	22,14
17	916719	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	0,000	5 329,000	5 329,000	1,48	0,00	7 886,92	7 886,92
								0,00	42 523,80	42 523,80
		Vícepráce celkem						0,00	242 099,69	292 645,32
		DPH 21 %						0,00	50 836,59	61 455,52
		CELKEM vč. DPH						0,00	292 915,61	354 100,84
		ME NE PRÁ CE								
01		01-DIO-et.1 Dopravné inženýrské opatření - 1. etapa								
9		Ostatní konstrukce a práce								
2	914001.R	ZHOTOVENÍ POLEPU ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI	KUS	6,500	0,000	-6,500	92,21	599,37	0,00	-599,37
3	914002.R	ZHOTOVENÍ POLEPU VELKOPLOŠNÉ ZNAČKY	KUS	6,000	0,000	-6,000	154,92	929,52	0,00	-929,52
4	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	28,000	0,000	-28,000	44,26	1 239,28	0,00	-1 239,28
5	914139	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VĚL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	980,000	0,000	-980,000	2,95	2 891,00	0,00	-2 891,00
6	914432	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	6,000	0,000	-6,000	44,26	265,56	0,00	-265,56
7	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	210,000	0,000	-210,000	5,90	1 239,00	0,00	-1 239,00
8	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	40,000	0,000	-40,000	29,51	1 180,40	0,00	-1 180,40
9	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNĚ	KSDEN	1 400,000	0,000	-1 400,000	1,48	2 072,00	0,00	-2 072,00
10	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	6,500	0,000	-6,500	307,38	1 997,97	0,00	-1 997,97
11	916112	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,000	-2,000	98,36	196,72	0,00	-196,72
12	916119	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ	KSDEN	70,000	0,000	-70,000	30,74	2 151,80	0,00	-2 151,80
13	916122	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,500	0,000	-1,500	147,54	221,31	0,00	-221,31

14	916123	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTAZ	KUS	1,000	0,000	-1,000	98,36	0,00	-98,36
15	916129	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KSDEN	52,500	0,000	-52,500	73,77	3 872,93	-3 872,93
16	916152	SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	295,09	0,00	-295,09
17	916159	SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	35,000	0,000	-35,000	295,09	10 328,15	-10 328,15
18	916322	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,500	0,000	-1,500	44,26	0,00	-66,39
19	916323	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	-1,000	29,51	0,00	-29,51
20	916329	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	52,500	0,000	-52,500	4,43	232,58	-232,58
21	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	14,000	0,000	-14,000	29,51	413,14	-413,14
22	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	14,000	0,000	-14,000	14,75	206,50	-206,50
23	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	490,000	0,000	-490,000	2,21	1 082,90	-1 082,90
24	916712	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	52,000	0,000	-52,000	14,75	767,00	-767,00
25	916713	UPEVNOVACÍ KONSTR - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	-4,000	7,38	29,52	-29,52
26	916719	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	1 820,000	0,000	-1 820,000	1,48	2 693,60	-2 693,60
		Měně práce a část						<b>35 099,60</b>	<b>-35 099,60</b>
02		02-DIO-et.2 Dopravně inženýrské opatření - 2. etapa.							
9		Ostatní konstrukce a práce							
1	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	0,000	-3,000	29,51	88,53	-88,53
2	914139	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VĚL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	588,000	0,000	-588,000	2,95	1 734,60	-1 734,60
3	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	126,000	0,000	-126,000	5,90	743,40	-743,40
4	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	29,51	29,51	-29,51
5	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	3,000	0,000	-3,000	14,75	44,25	-44,25
6	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE	KSDEN	840,000	0,000	-840,000	1,48	1 243,20	-1 243,20
7	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	3,250	0,000	-3,250	307,38	998,99	-998,99
8	915112	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKE - ODSTRANĚNÍ	M2	3,250	0,000	-3,250	270,50	879,13	-879,13
9	916119	DOPRAV SVĚTLA VYSTRAZ SAMOSTATNĚ - NAJEMNE	KSDEN	42,000	0,000	-42,000	30,74	1 291,08	-1 291,08
10	916122	DOPRAV SVĚTLA VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	147,54	147,54	-147,54
11	916123	DOPRAV SVĚTLA VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,500	0,000	-1,500	98,36	147,54	-147,54
12	916129	DOPRAV SVĚTLA VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KSDEN	31,500	0,000	-31,500	73,77	2 323,76	-2 323,76
13	916159	SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	0,500	0,000	-0,500	221,31	110,66	-110,66
14	916159	SEMAFOROVA PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	21,000	0,000	-21,000	295,09	6 196,89	-6 196,89
15	916322	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	44,26	44,26	-44,26
16	916323	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,500	0,000	-1,500	29,51	44,27	-44,27
17	916329	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	31,500	0,000	-31,500	4,43	139,55	-139,55
18	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	12,500	0,000	-12,500	29,51	368,88	-368,88
19	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	12,500	0,000	-12,500	14,75	184,38	-184,38



20	916369	SMEROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	262,500	0,000	-262,500	2,21	580,13	0,00	-580,13
21	916712	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,000	0,000	-4,000	14,75	59,00	0,00	-59,00
22	916713	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	0,000	-4,000	7,38	29,52	0,00	-29,52
23	916719	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNÉ	KSDEN	1 092,000	0,000	-1 092,000	1,48	1 616,16	0,00	-1 616,16
		Méně práce za část						<b>19 045,19</b>	<b>0,00</b>	<b>-19 045,19</b>
<b>03</b>		<b>03-DIO-et.3 Dopravně inženýrské opatření - 3. etapa</b>								
9		Ostatní konstrukce a práce								
1	914001.R	ZHOTOVENI POLEPU ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI	KUS	0,500	0,000	-0,500	92,21	46,11	0,00	-46,11
2	914132	DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	0,000	-2,000	44,26	88,52	0,00	-88,52
3	914133	DOPRAVNI ZNACKY ZAKLADNI VELIKOSTI OCELOVE FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,500	0,000	-4,500	29,51	132,80	0,00	-132,80
4	914139	DOPRAV ZNACKY ZAKLAD VEL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	567,000	0,000	-567,000	2,95	1 672,65	0,00	-1 672,65
5	914439	DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	126,000	0,000	-126,000	5,90	743,40	0,00	-743,40
6	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,000	-2,000	29,51	59,02	0,00	-59,02
7	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	4,500	0,000	-4,500	14,75	66,38	0,00	-66,38
8	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNÉ	KSDEN	819,000	0,000	-819,000	1,48	1 212,12	0,00	-1 212,12
9	915111	VODOROVNE DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKE - DOJÁVKA A POKLÁDKA	M2	3,250	0,000	-3,250	307,38	998,99	0,00	-998,99
10	915112	VODOROVNÉ DOPRAVNI ZNAČENI BARVOU HLADKE - ODSTRANĚNÍ	M2	3,250	0,000	-3,250	270,50	879,13	0,00	-879,13
11	916113	DOPRAV SVĚTLO VYSTRÁŽ SAMOSTATNĚ - DEMONTÁŽ	KUS	0,500	0,000	-0,500	49,18	24,59	0,00	-24,59
12	916119	DOPRAV SVĚTLO VYSTRÁŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNÉ	KSDEN	42,000	0,000	-42,000	30,74	1 291,08	0,00	-1 291,08
13	916122	DOPRAV SVĚTLO VYSTRÁŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	147,54	147,54	0,00	-147,54
14	916123	DOPRAV SVĚTLO VYSTRÁŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	-1,000	98,36	98,36	0,00	-98,36
15	916129	DOPRAV SVĚTLO VYSTRÁŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ	KSDEN	21,000	0,000	-21,000	73,77	1 549,17	0,00	-1 549,17
16	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	0,500	0,000	-0,500	295,09	147,55	0,00	-147,55
17	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	-1,000	221,31	221,31	0,00	-221,31
18	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNÉ	KSDEN	21,000	0,000	-21,000	295,09	6 196,89	0,00	-6 196,89
19	916322	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	44,26	44,26	0,00	-44,26
20	916323	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1,500	0,000	-1,500	29,51	44,27	0,00	-44,27
21	916329	DOPRAVNI ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	31,500	0,000	-31,500	4,43	139,55	0,00	-139,55
22	916362	SMĚROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	4,500	0,000	-4,500	29,51	132,80	0,00	-132,80
23	916363	SMĚROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	4,500	0,000	-4,500	14,75	66,38	0,00	-66,38
24	916369	SMĚROVACI DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNÉ	KSDEN	94,500	0,000	-94,500	2,21	208,85	0,00	-208,85
25	916712	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	3,500	0,000	-3,500	14,75	51,63	0,00	-51,63
26	916713	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLADNI DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0,000	-6,000	7,38	44,28	0,00	-44,28

27	916719	UPEVNOVACI KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	1 081,500	0,000	-1 081,500	1,48	1 600,62	0,00	-1 600,62
		Měně práce za část						17 908,25	0,00	-17 908,25
04		04-DIO-et.4 Dopravné inženýrské opatření - 4. etapa								
9		Ostatní konstrukce a práce								
1	91400	DOČASNĚ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STAVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK	KUS	12,000	0,000	-12,000	29,51	354,12	0,00	-354,12
2	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,500	0,000	-3,500	44,26	154,91	0,00	-154,91
3	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	26,000	0,000	-26,000	29,51	767,26	0,00	-767,26
4	914139	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VĚL OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	364,000	0,000	-364,000	2,95	1 073,80	0,00	-1 073,80
5	914433	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	6,000	0,000	-6,000	29,51	177,06	0,00	-177,06
6	914439	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FOLIE TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	84,000	0,000	-84,000	5,90	495,60	0,00	-495,60
7	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY PRESUNEM	KUS	3,500	0,000	-3,500	29,51	103,29	0,00	-103,29
8	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	38,000	0,000	-38,000	14,75	560,50	0,00	-560,50
9	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNE	KSDEN	532,000	0,000	-532,000	1,48	787,36	0,00	-787,36
10	915111	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	5,000	0,000	-5,000	307,38	1 536,90	0,00	-1 536,90
11	915112	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - ODSTRANĚNÍ	M2	5,000	0,000	-5,000	270,50	1 352,50	0,00	-1 352,50
12	916113	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNE - DEMONTÁŽ	KUS	1,500	0,000	-1,500	49,18	73,77	0,00	-73,77
13	916119	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SAMOSTATNE - NAJEMNE	KSDEN	21,000	0,000	-21,000	30,74	645,54	0,00	-645,54
14	916122	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	147,54	147,54	0,00	-147,54
15	916123	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	-1,000	98,36	98,36	0,00	-98,36
16	916129	DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNE	KSDEN	14,000	0,000	-14,000	73,77	1 032,78	0,00	-1 032,78
17	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	1,000	0,000	-1,000	295,09	295,09	0,00	-295,09
18	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	1,000	0,000	-1,000	221,31	221,31	0,00	-221,31
19	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NAJEMNE	KSDEN	14,000	0,000	-14,000	295,09	4 131,26	0,00	-4 131,26
20	916322	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	2,000	0,000	-2,000	44,26	88,52	0,00	-88,52
21	916323	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,000	-2,000	29,51	59,02	0,00	-59,02
22	916329	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	28,000	0,000	-28,000	4,43	124,04	0,00	-124,04
23	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	3,500	0,000	-3,500	29,51	103,29	0,00	-103,29
24	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,500	0,000	-3,500	14,75	51,63	0,00	-51,63
25	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNE	KSDEN	49,000	0,000	-49,000	2,21	108,29	0,00	-108,29
26	916712	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PRESUNEM	KUS	5,000	0,000	-5,000	14,75	73,75	0,00	-73,75
27	916713	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	50,500	0,000	-50,500	7,38	372,69	0,00	-372,69
28	916719	UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NAJEMNE	KSDEN	707,000	0,000	-707,000	1,48	1 046,36	0,00	-1 046,36





1	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4.500	0,000	-4.500	44,26	199,17	0,00	-199,17
2	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	1.500	0,000	-1.500	29,51	44,27	0,00	-44,27
3	914139	DOPRAV ZNAČKY ZAKLAD VĚL OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KSDEN	269.500	0,000	-269.500	2,95	795,03	0,00	-795,03
4	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ	KUS	4.500	0,000	-4.500	29,51	132,80	0,00	-132,80
5	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NAJEMNĚ	KUS	1.500	0,000	-1.500	14,75	22,13	0,00	-22,13
6	914929	VODOROVNĚ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKĚ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	4.000	0,000	-4.000	1,48	398,86	0,00	-398,86
7	915111	DOPRAV SVĚTLA VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	1.000	0,000	-1.000	986,08	986,08	0,00	-986,08
8	916112	DOPRAV SVĚTLA VYSTRAŽ SAMOSTATNĚ - NAJEMNĚ	KSDEN	49.000	0,000	-49.000	30,74	1 506,26	0,00	-1 506,26
9	916119	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	13.000	0,000	-13.000	29,51	383,63	0,00	-383,63
10	916362	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - DEMONTÁŽ	KUS	13.000	0,000	-13.000	14,75	191,75	0,00	-191,75
11	916363	SMEROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FOLII TR 2 - NAJEMNĚ	KSDEN	637.000	0,000	-637.000	2,21	1 407,77	0,00	-1 407,77
12	916622	VODIČI STĚNY Z DILCŮ BETON - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	55.000	0,000	-55.000	154,92	8 520,60	0,00	-8 520,60
13	916629	VODIČI STĚNY Z DILCŮ BETON - NAJEMNĚ	M DEN	2 695.000	0,000	-2 695.000	3,69	9 944,55	0,00	-9 944,55
14	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6.000	0,000	-6.000	14,75	88,50	0,00	-88,50
15	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	1.500	0,000	-1.500	7,38	11,07	0,00	-11,07
16	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NAJEMNĚ	KSDEN	343.000	0,000	-343.000	1,48	507,64	0,00	-507,64
17		Méně práce za část						26 369,63	0,00	-26 369,63
		Méně práce celkem						124 093,55	0,00	-124 093,55
		DPH 21 %						26 059,64	0,00	-26 059,64
		CELKEM vč. DPH						150 153,19	0,00	-150 153,19
		Bilance (více a méně práce) za SO 02 - DIO-et.1-5						124 093,55	242 073,02	168 551,78
		DPH 21 %						26 059,64	50 836,59	35 395,87
		CELKEM vč. DPH						150 153,19	292 915,61	203 947,65

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihomoravský kraj		29. 11. 2023
TDS : Miloslav Jindra		30. 11. 2023
zhotovitel : STRABAG a.s.	Miloslav Jindra	
Projektant: ATELIER SIS	Ladislav Honner	
	Ing. František Stráský	

**STRABAG**

STRABAG a.s.  
Kacírkova 982/4, 158 00 Praha 5  
IČ: 60835744  
(336)

## Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 5

### 1) Změnový list č. 5 - přípočty stavby:

SO 02 - DIO - Realizace díla vyvolala změny oproti původním etapám DIA v PD v rozsahu etap 1 až 6 z důvodu doplnění dopravního značení objízdných tras a uzavírek. Nově je přidána etapa 0, která v původním PD nebyla. Etapy 2 a 5 byly provedeny za částečné uzavírky. Etapy 3, 4 a 6 proběhly za plné uzavírky pro možnost realizace stavebních prací.

### 2) Změnový list č. 5 - odpočty stavby:

SO 02 - DIO - Realizace díla vyvolala změny oproti původním etapám DIA v PD v rozsahu etap 1 až 6 z důvodu doplnění dopravního značení objízdných tras a uzavírek. Nově je přidána etapa 0, která v původním PD nebyla. Etapy 2 a 5 byly provedeny za částečné uzavírky. Etapy 3, 4 a 6 proběhly za plné uzavírky pro možnost realizace stavebních prací.

3)

4)

5)
